

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Karlov

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— Napětí

Číslo testu: 20
Číslo baterie UPS 1 (bl. 1-16)
Datum: 01.11.24
Čas: 08:01
Typ baterií: p.com SB 110
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 50 A
Konečné napětí: 172,8 V


Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 28,2°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nacházejí v dobrém stavu.

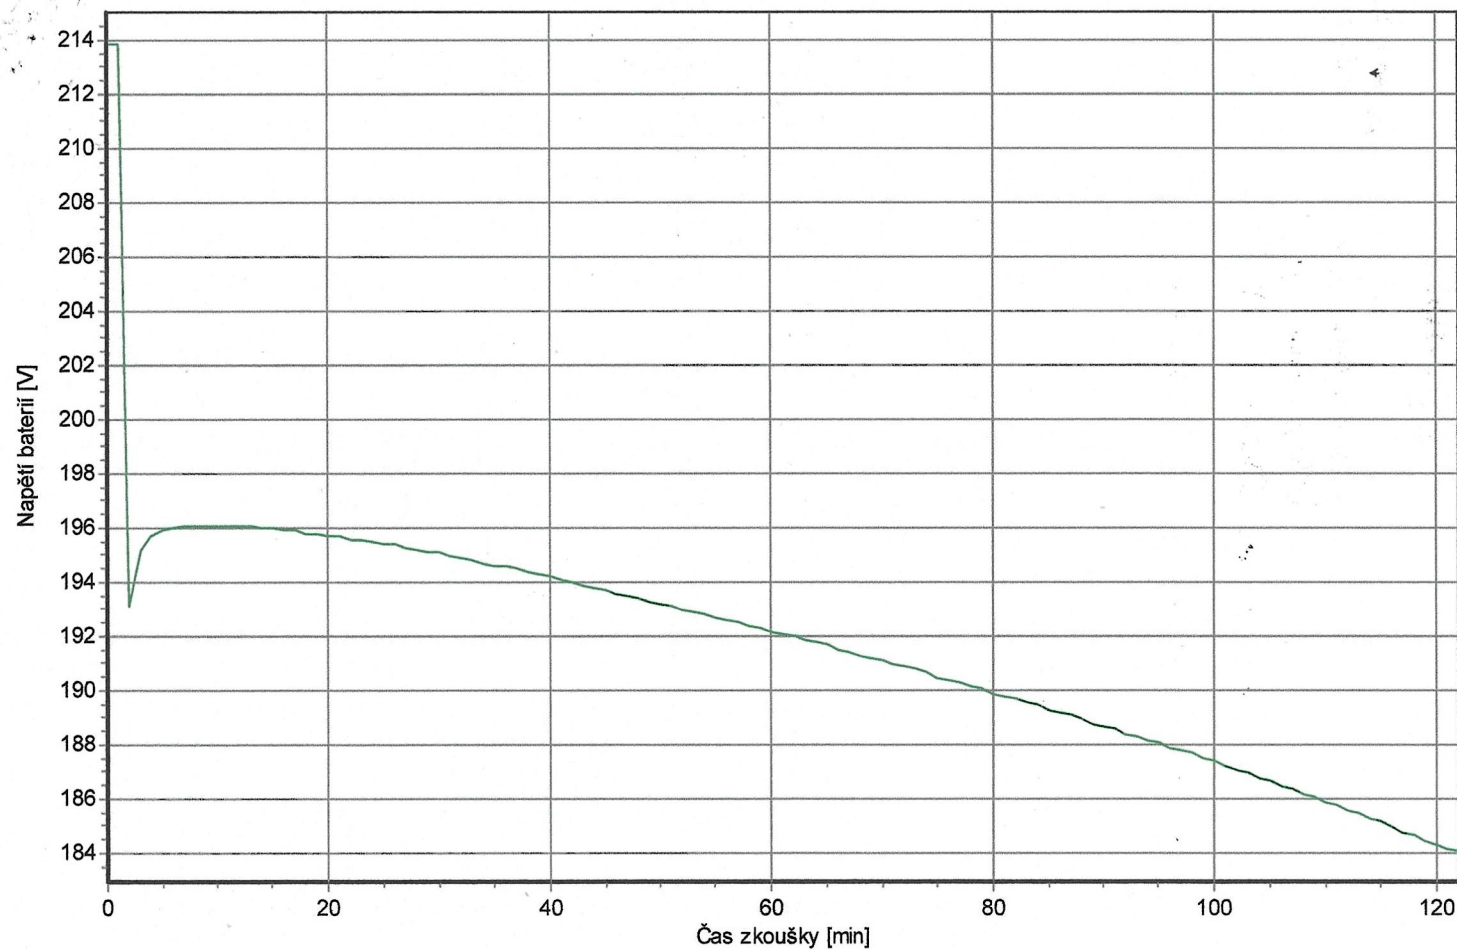

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Karlov

Zakázka:

PRE

Konečné napětí

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Číslo testu: 21
Číslo baterie UPS 1 (bl. 17-32)
Datum: 01.11.24
Čas: 10:04
Typ baterií: p.com SB 110
Typ zkoušky: 120 min
Vybíjecí proud: 50 A
Konečné napětí: 172,8 V

Délka cyklu: 60 s
Délka zkoušky: 120,0 min
Teplota: 29,1°C
Za provozovatele: PEG s.r.o.
Měřil: Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nacházejí v dobrém stavu.

