Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	30
Číslo baterie	B6, 24V
Datum:	26.09.19
Čas:	11:42
Typ baterií:	FLL 6-225
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	21,6 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	121,0 min
Teplota:	12,8°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **100,8 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

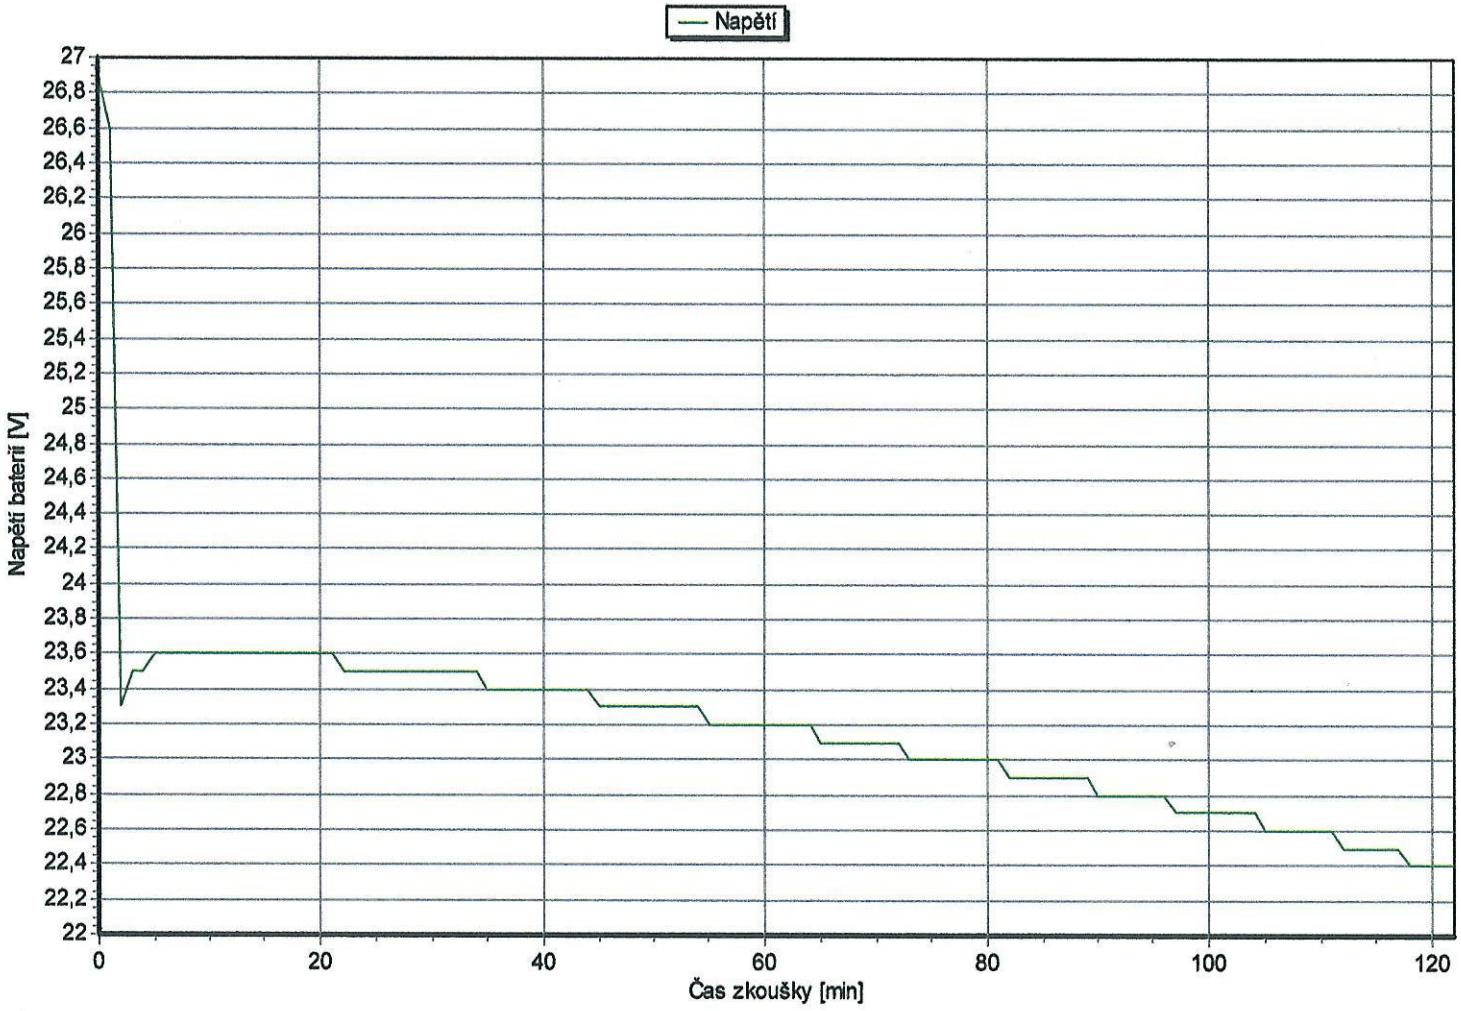

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	29
Číslo baterie	B5, 24V
Datum:	26.09.19
Čas:	09:36
Typ baterií:	FLL 6-225
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	21,6 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	121,0 min
Teplota:	10,0°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar

Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,8 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

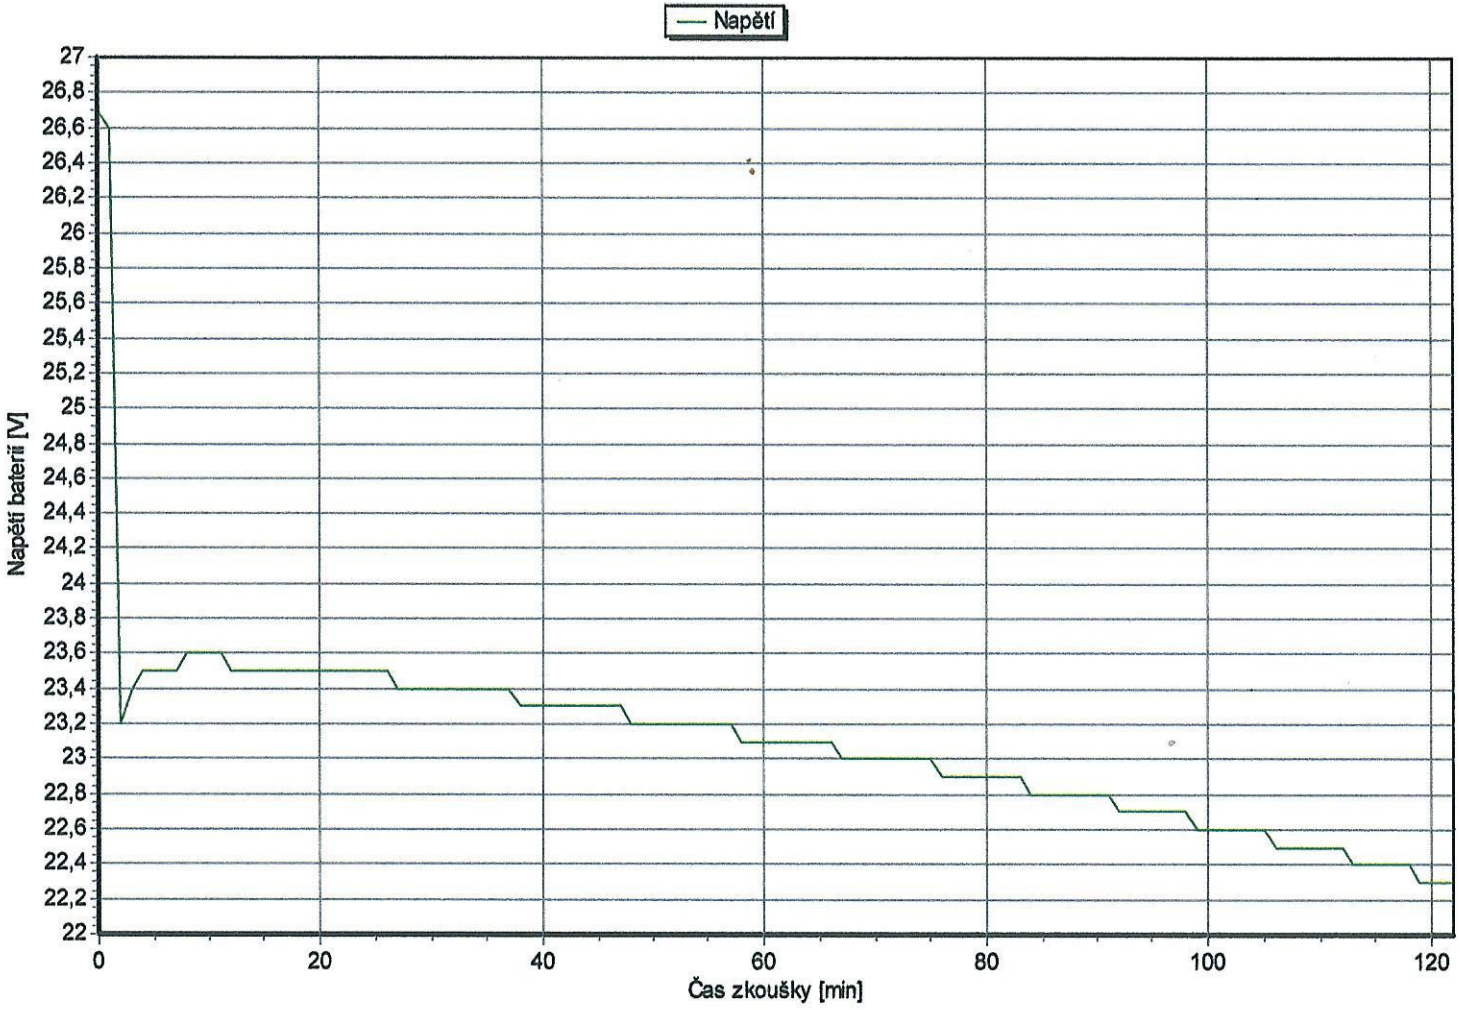

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	28
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2013
Datum:	25.09.19
Čas:	10:22
Typ baterií:	6 OPzS 300
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	100 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	25,0°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.

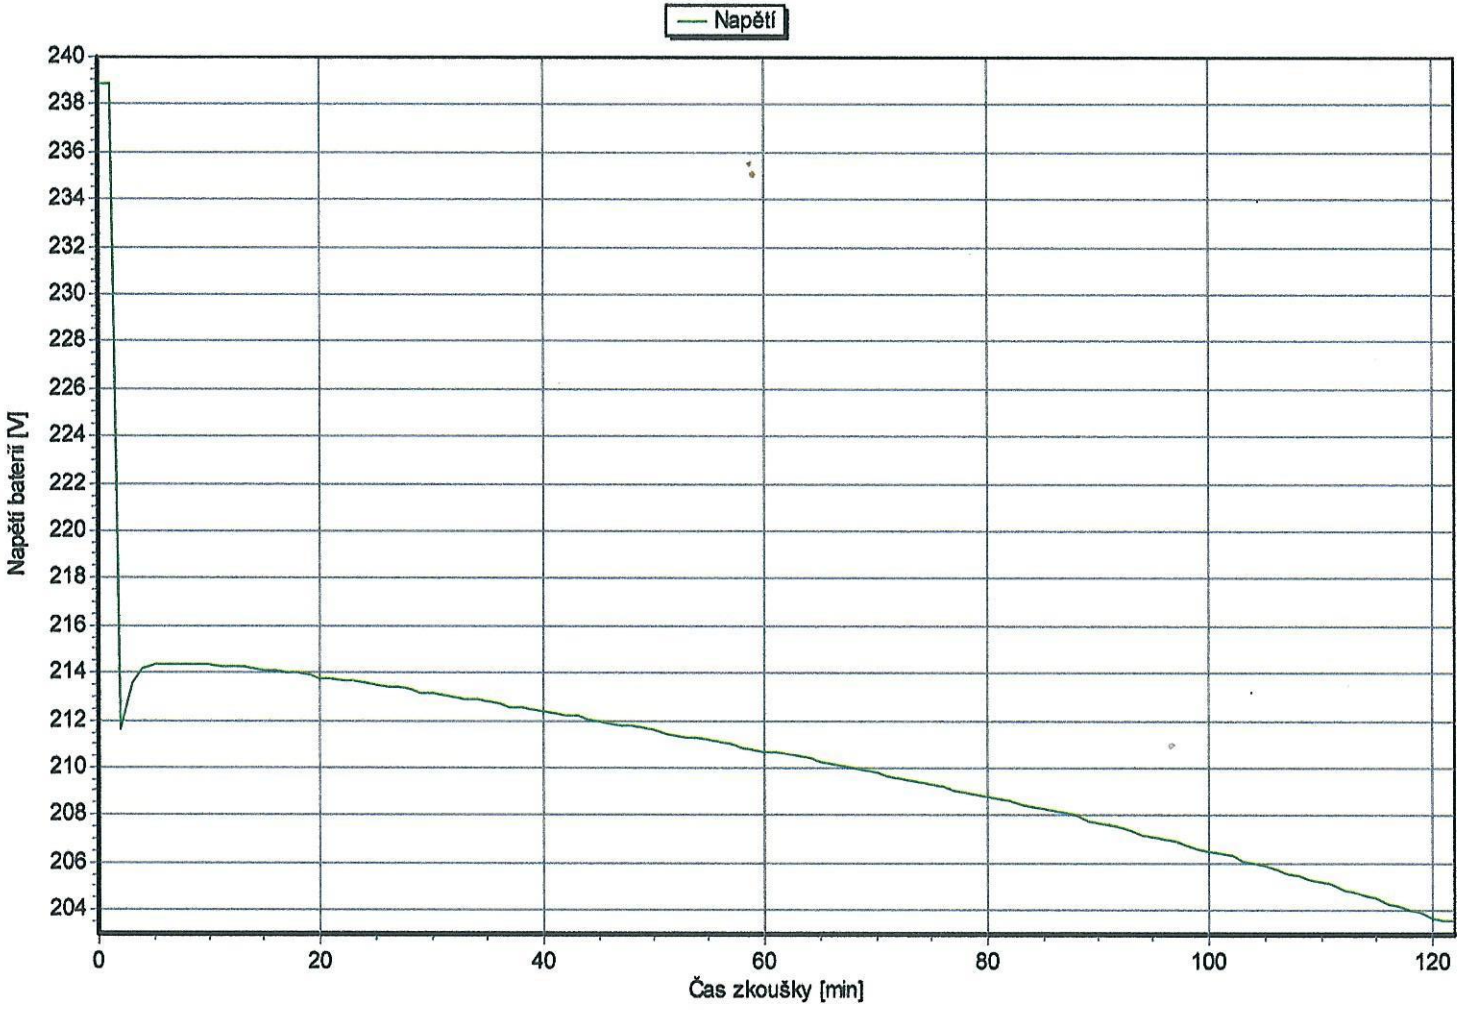

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Pražačka

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	27
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2013
Datum:	25.09.19
Čas:	08:16
Typ baterií:	6 OPzS 300
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	100 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	23,9°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
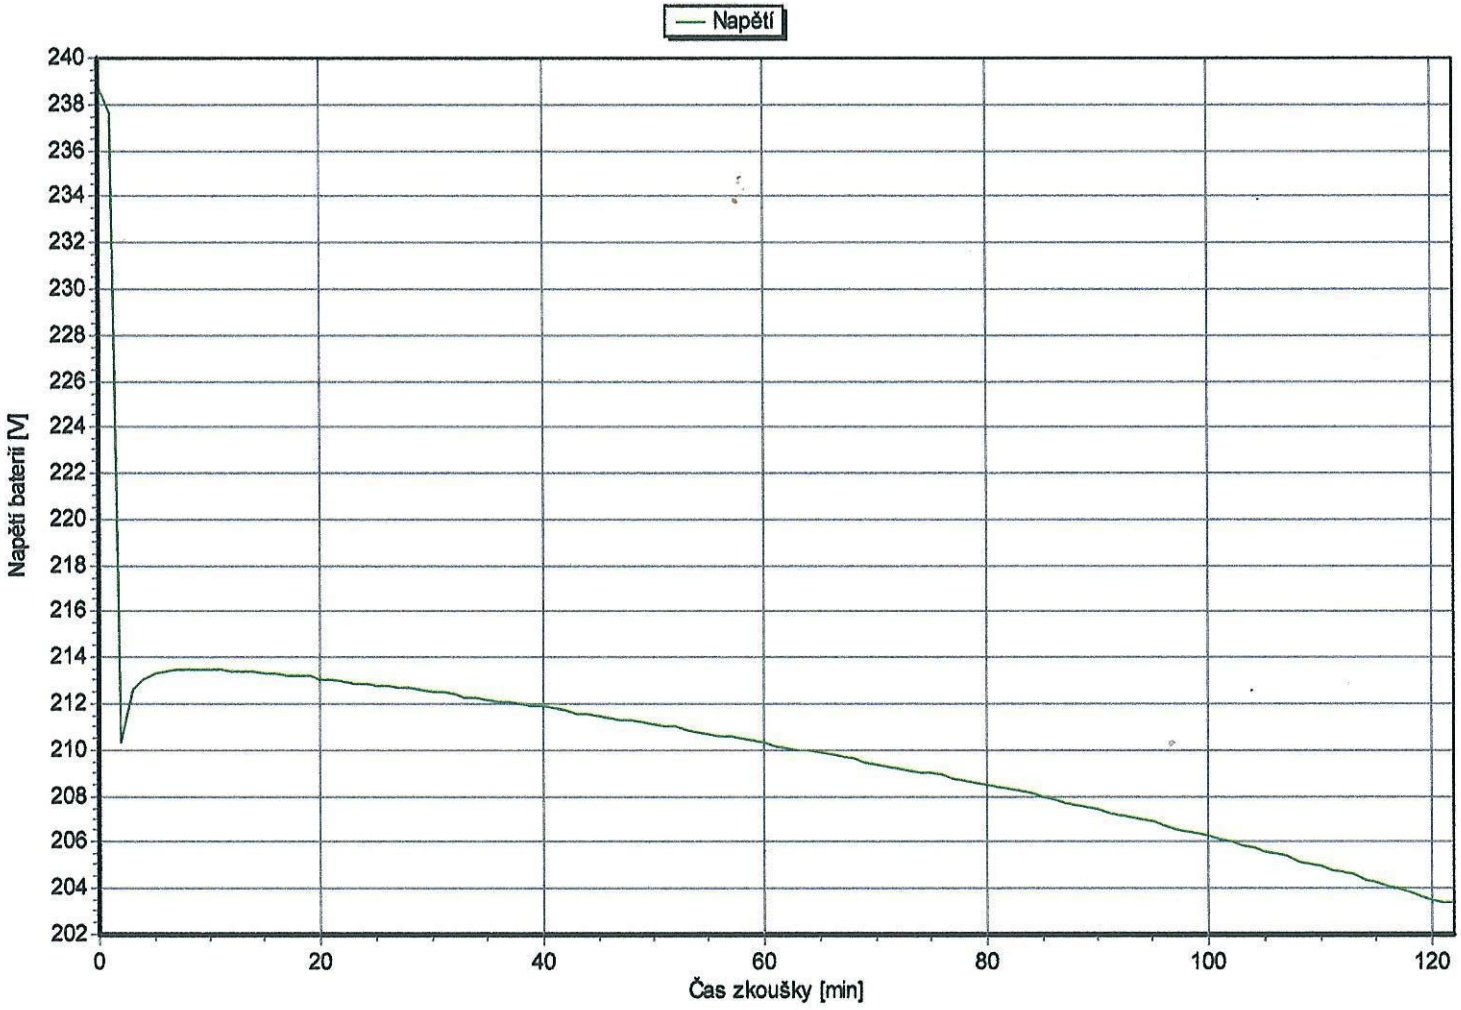
Baterie se nachází v dobrém stavu.
