Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Čislo testu:	38
Číslo baterie	B2 220V
Datum:	16.04.18
Čas:	13:40
Typ baterií:	SB 50
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	22,4 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	1,0 min
Teplota:	24,3°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **0,8 %**

Poznámka:

Baterie je zcela nefunkční a neplní žádnou záluhu. Doporučujeme okamžitou výměnu.

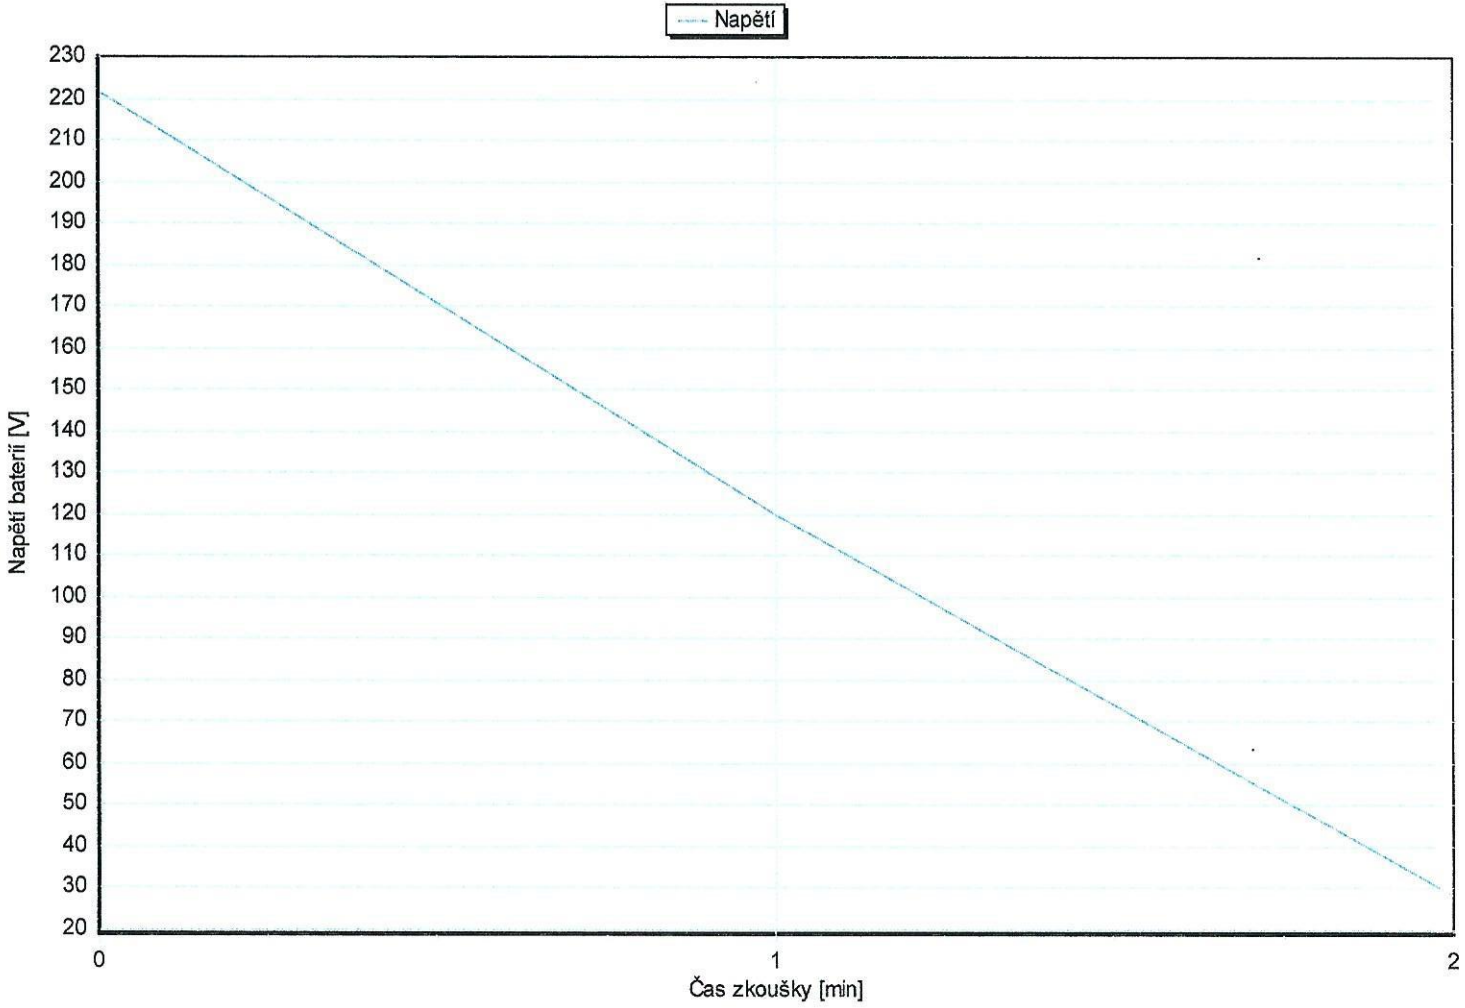

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	37
Číslo baterie	B1 220V
Datum:	16.04.18
Čas:	13:25
Typ baterií:	SB 50
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	22,4 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	1,0 min
Teplota:	24,3°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**0,8 %**

Poznámka:

Baterie je zcela nefunkční a neplní žádnou záluhu. Doporučujeme okamžitou výměnu.

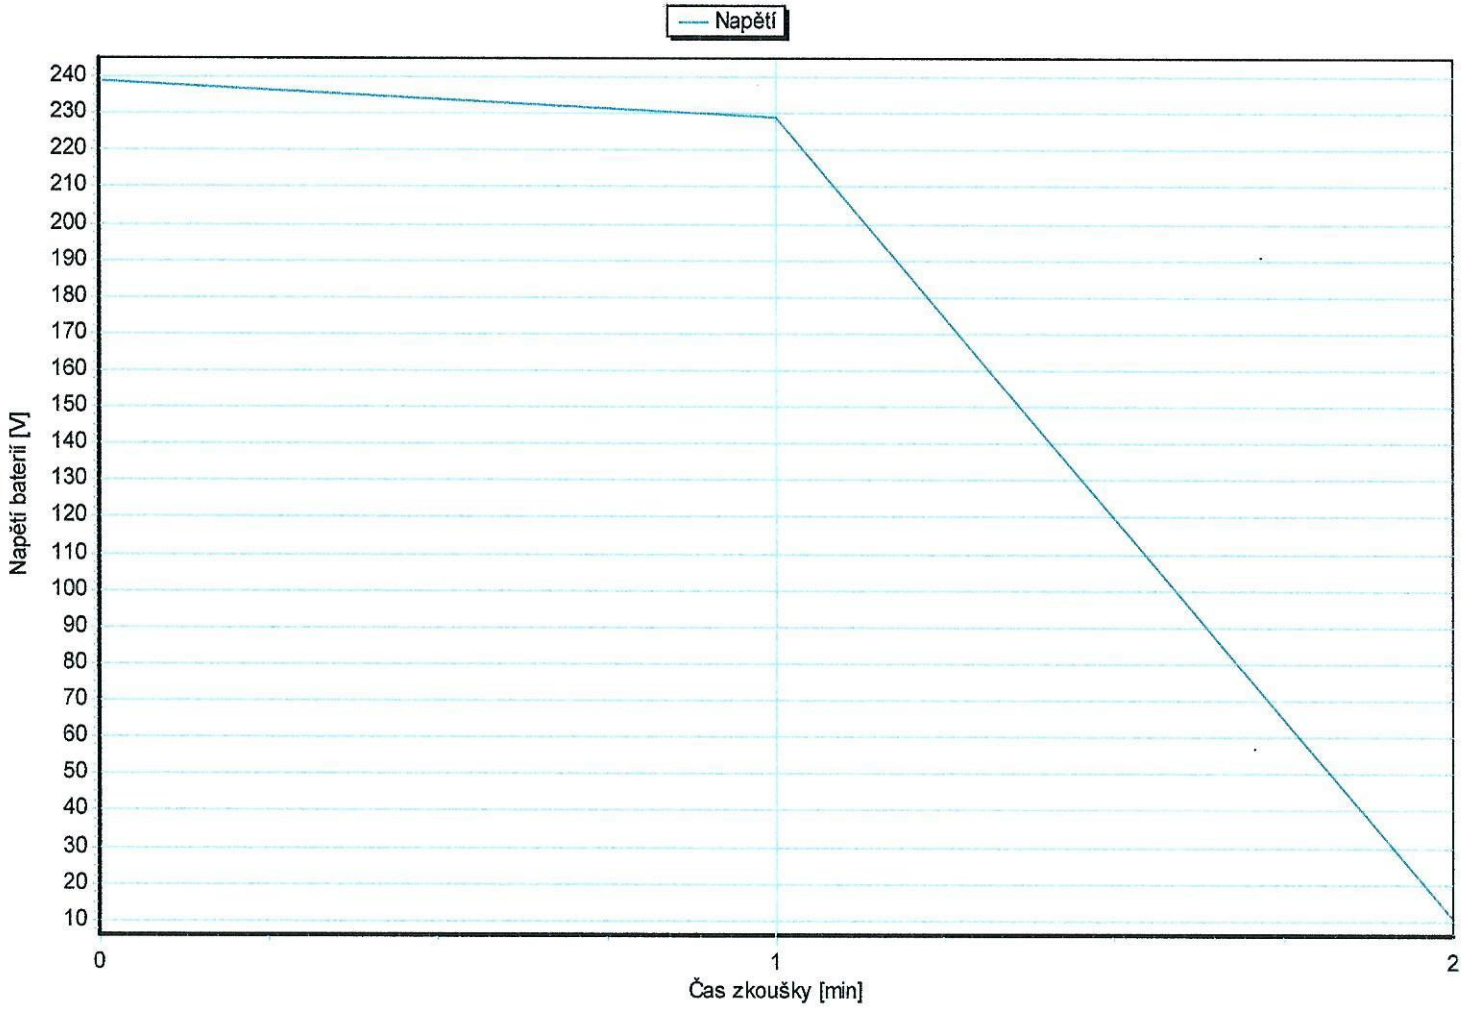

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	41
Číslo baterie	UPS 2/2 bl.17-32
Datum:	17.04.18
Čas:	10:52
Typ baterií:	SB 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	106,0 min
Teplota:	25,6°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**88,3 %**

Poznámka:

Baterie se nachází ve špatném stavu,doporučujeme její výměnu.Velmi špatný blok 19,20,24,25,28.

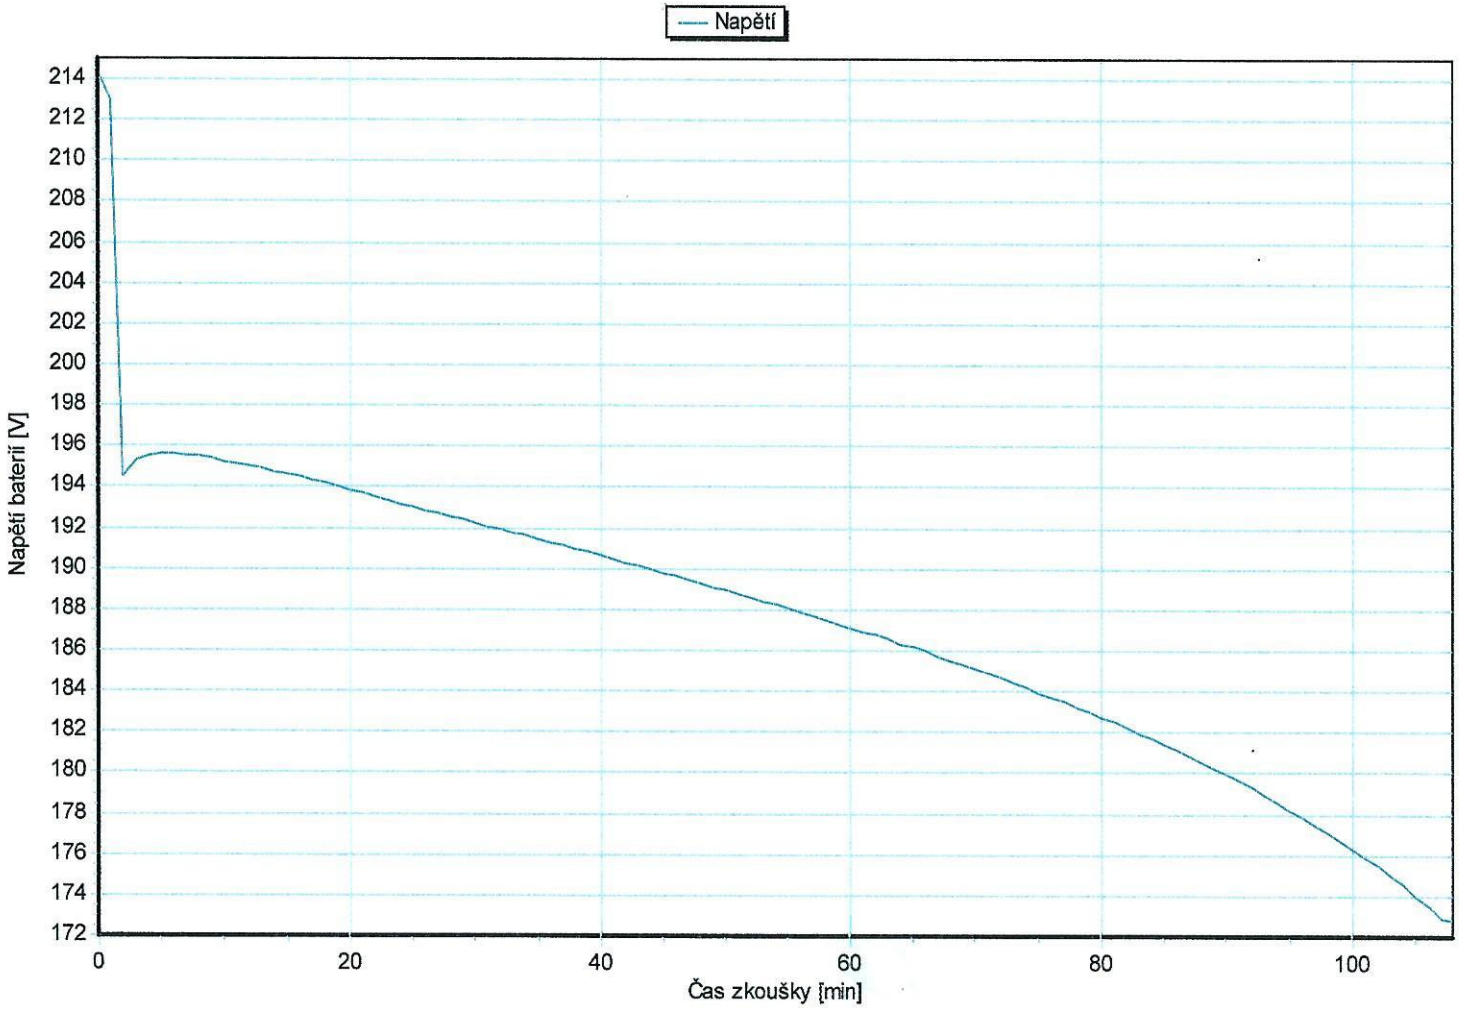

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	40
Číslo baterie	UPS 2/1 bl.1-16
Datum:	17.04.18
Čas:	08:48
Typ baterií:	SB 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	102,0 min
Teplota:	25,8°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**85,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází ve špatném stavu,doporučujeme její výměnu.Velmi špatný blok 2,4,5,7,8,15.

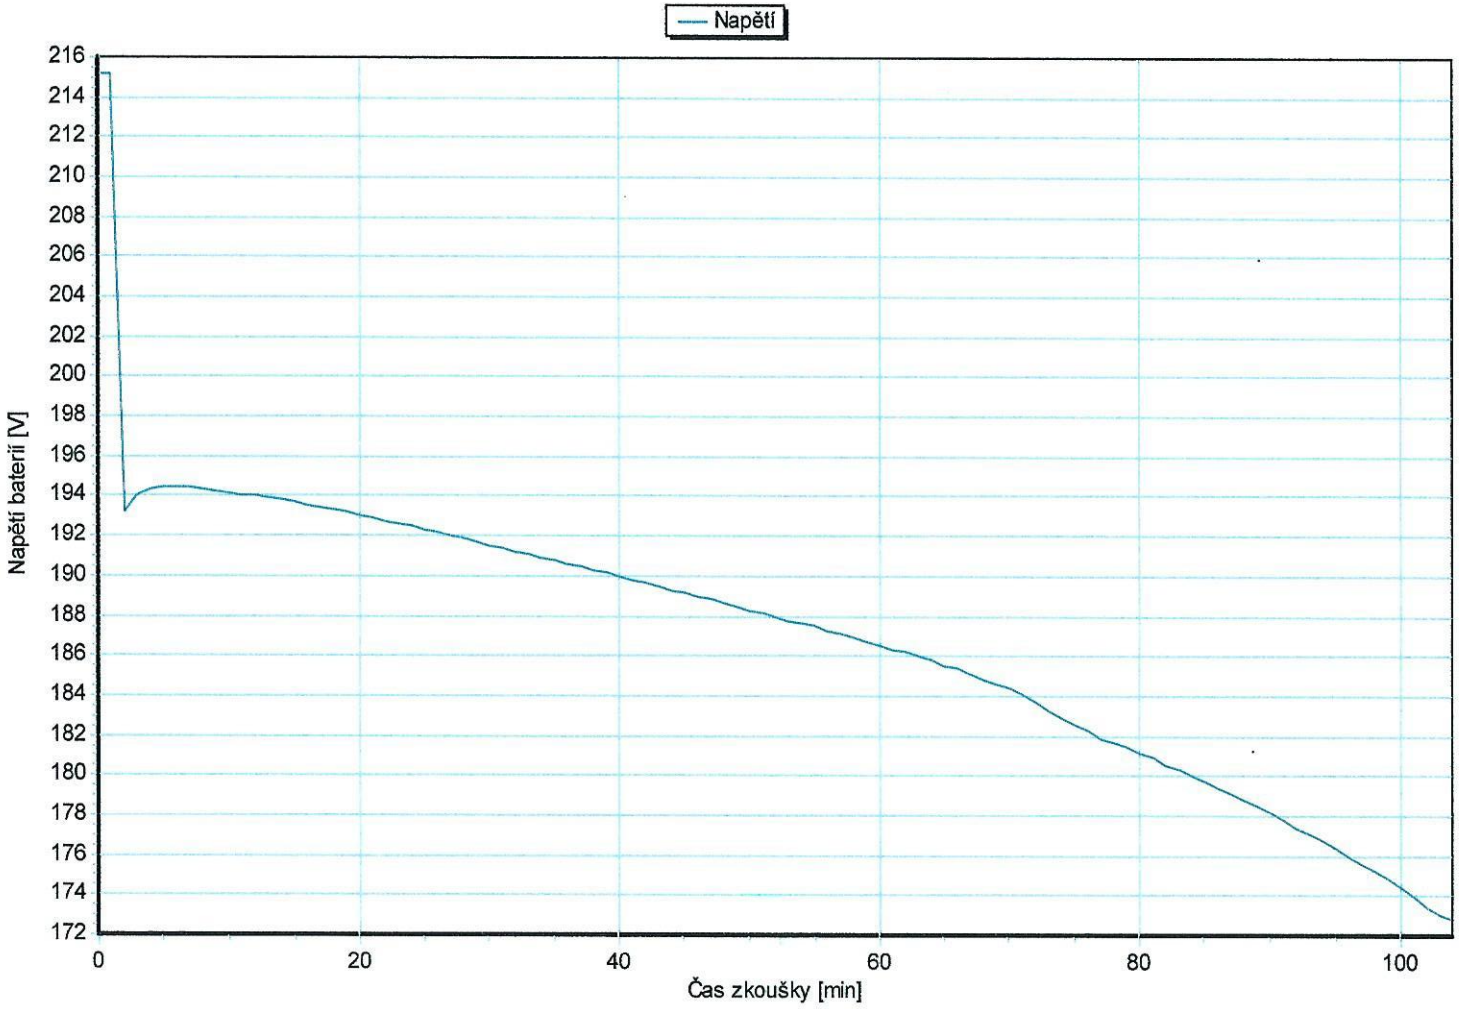

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	29
Číslo baterie	UPS 1/2 bl.17-32
Datum:	16.04.18
Čas:	11:14
Typ baterií:	SB 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	28,7°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází ve zhoršeném stavu.
Doporučujeme vyměnit bloky 20,32.

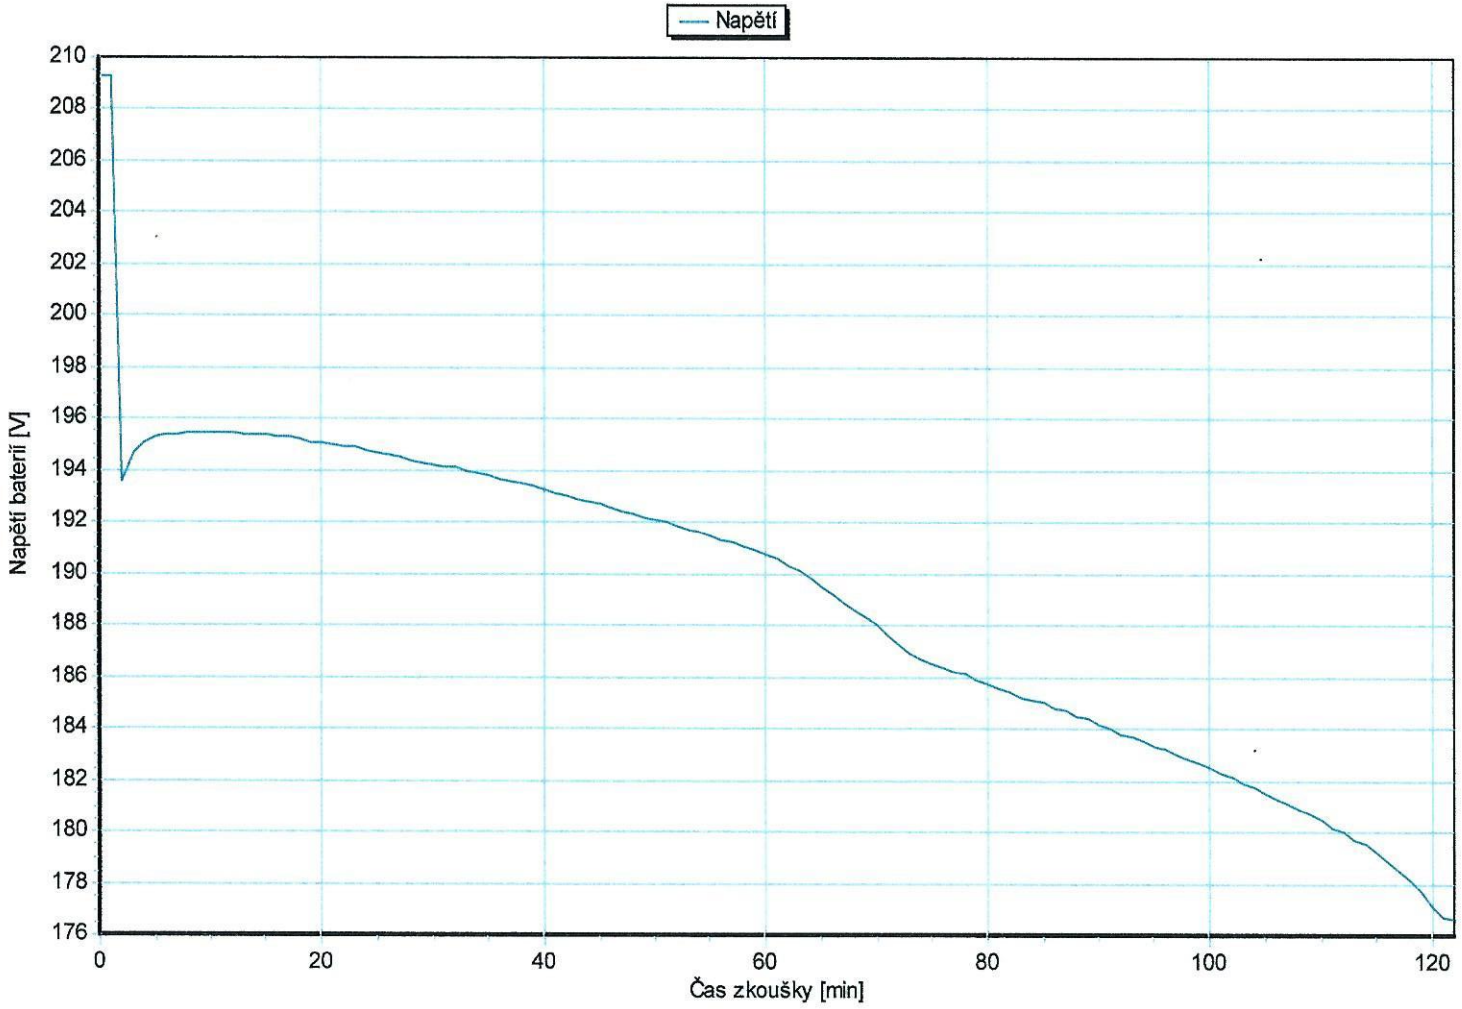

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	28
Číslo baterie	UPS 1/1 bl.1-16
Datum:	16.04.18
Čas:	09:08
Typ baterií:	SB 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	26,5°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
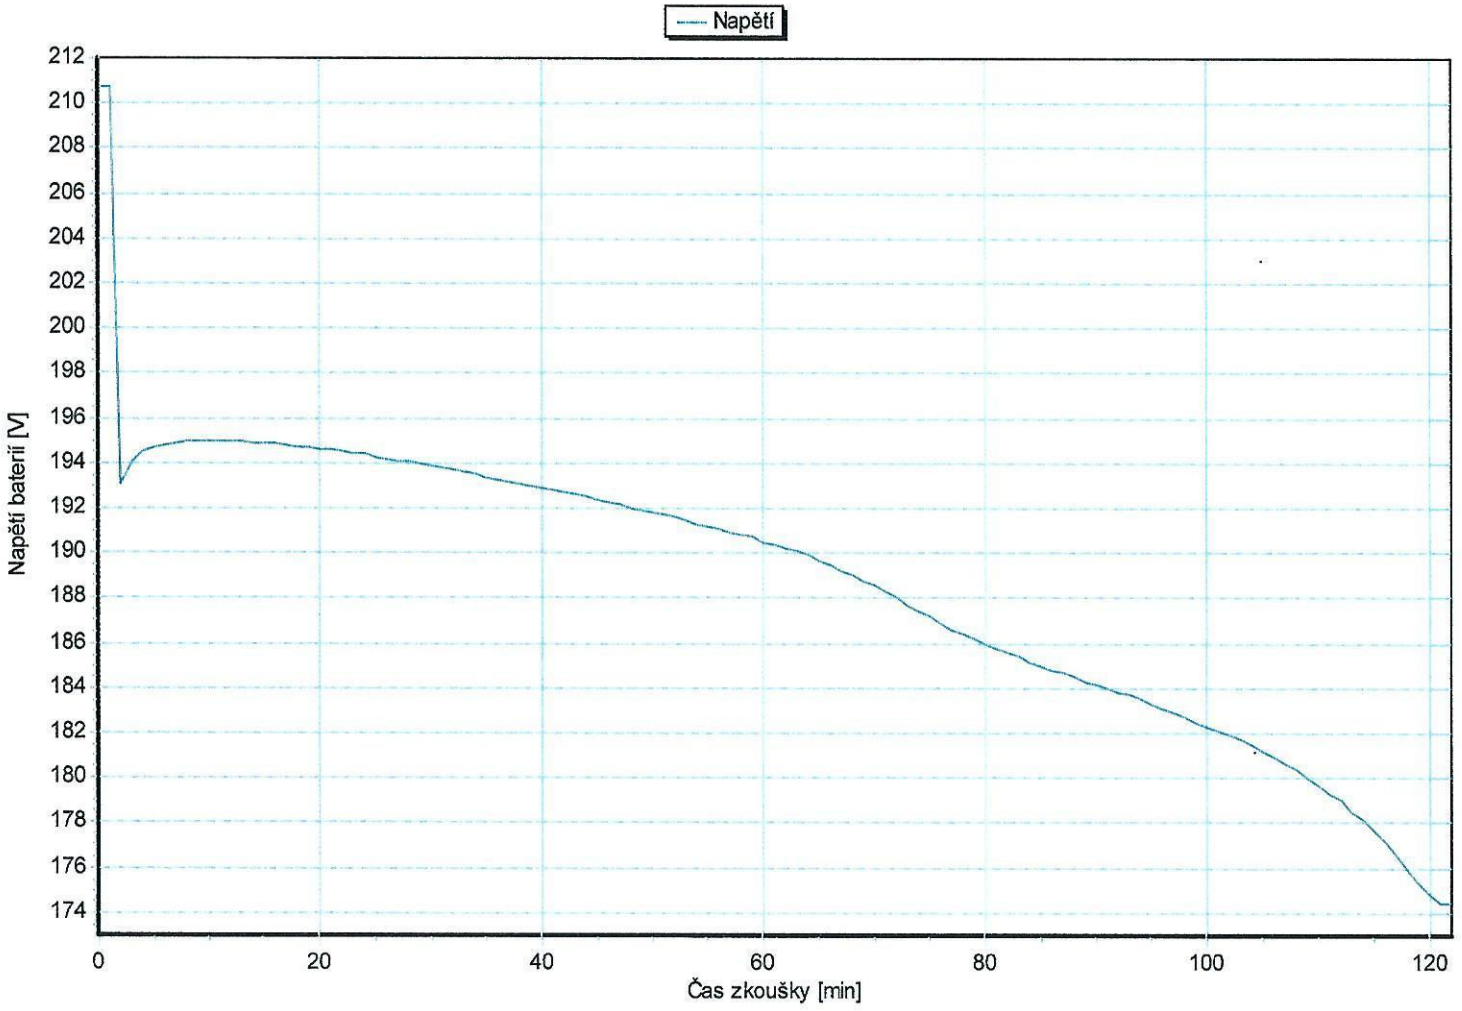
Baterie se nachází ve zhoršeném stavu.
Doporučujeme vyměnit bloky 3,9,16.
