Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	16
Číslo baterie	UPS 1/1 bl.1-16
Datum:	13.08.19
Čas:	08:30
Typ baterií:	SBS 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	93,0 min
Teplota:	28,4°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**77,5 %**

Poznámka:

Tato polovina UPS baterie je ve velmi špatném stavu,bl. 2,5,8,12,15 jsou zcela nevyhovující.Doporučení viz. bat. 1/2.

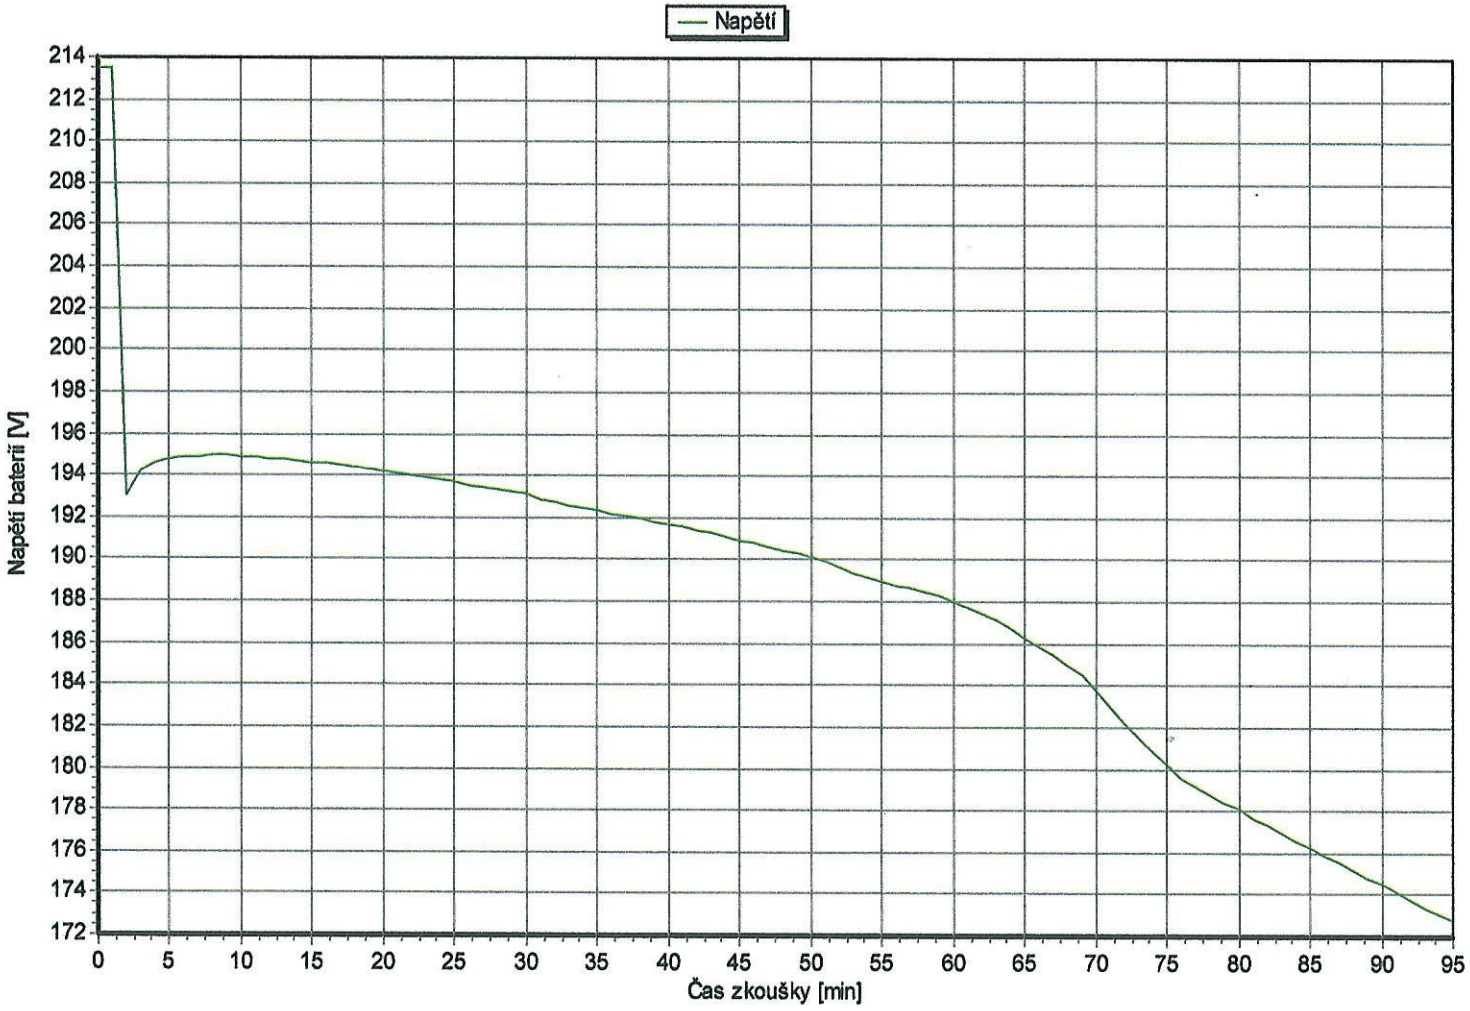

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	17
Číslo baterie	UPS 1/2 bl.17-32
Datum:	13.08.19
Čas:	10:55
Typ baterií:	SBS 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	24,8 A
Konečné napětí:	162 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	8,0 min
Teplota:	28,6°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**6,7 %**

Poznámka:
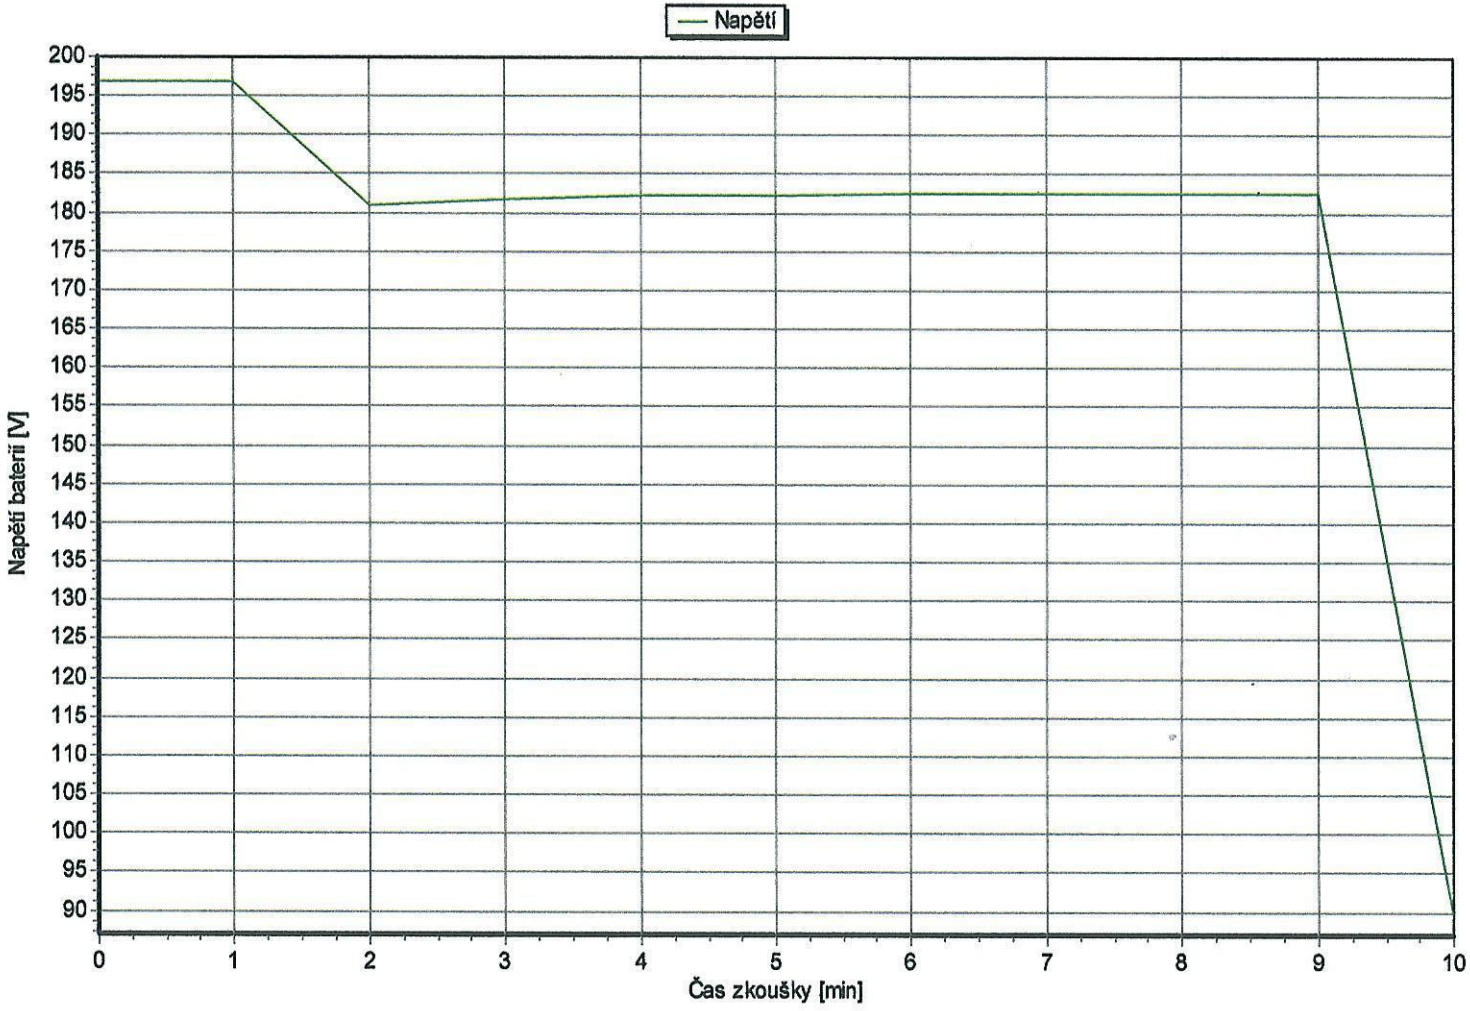
Měřeno bez bloku 21,který je vadný,i tak je baterie zálohy neschopna.Doporučujeme okamžitou výměnu celé UPS baterie.
