Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	39
Číslo baterie	Bat.2, 220V, r.v.2006
Datum:	13.09.18
Čas:	10:16
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	100 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	25,5°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

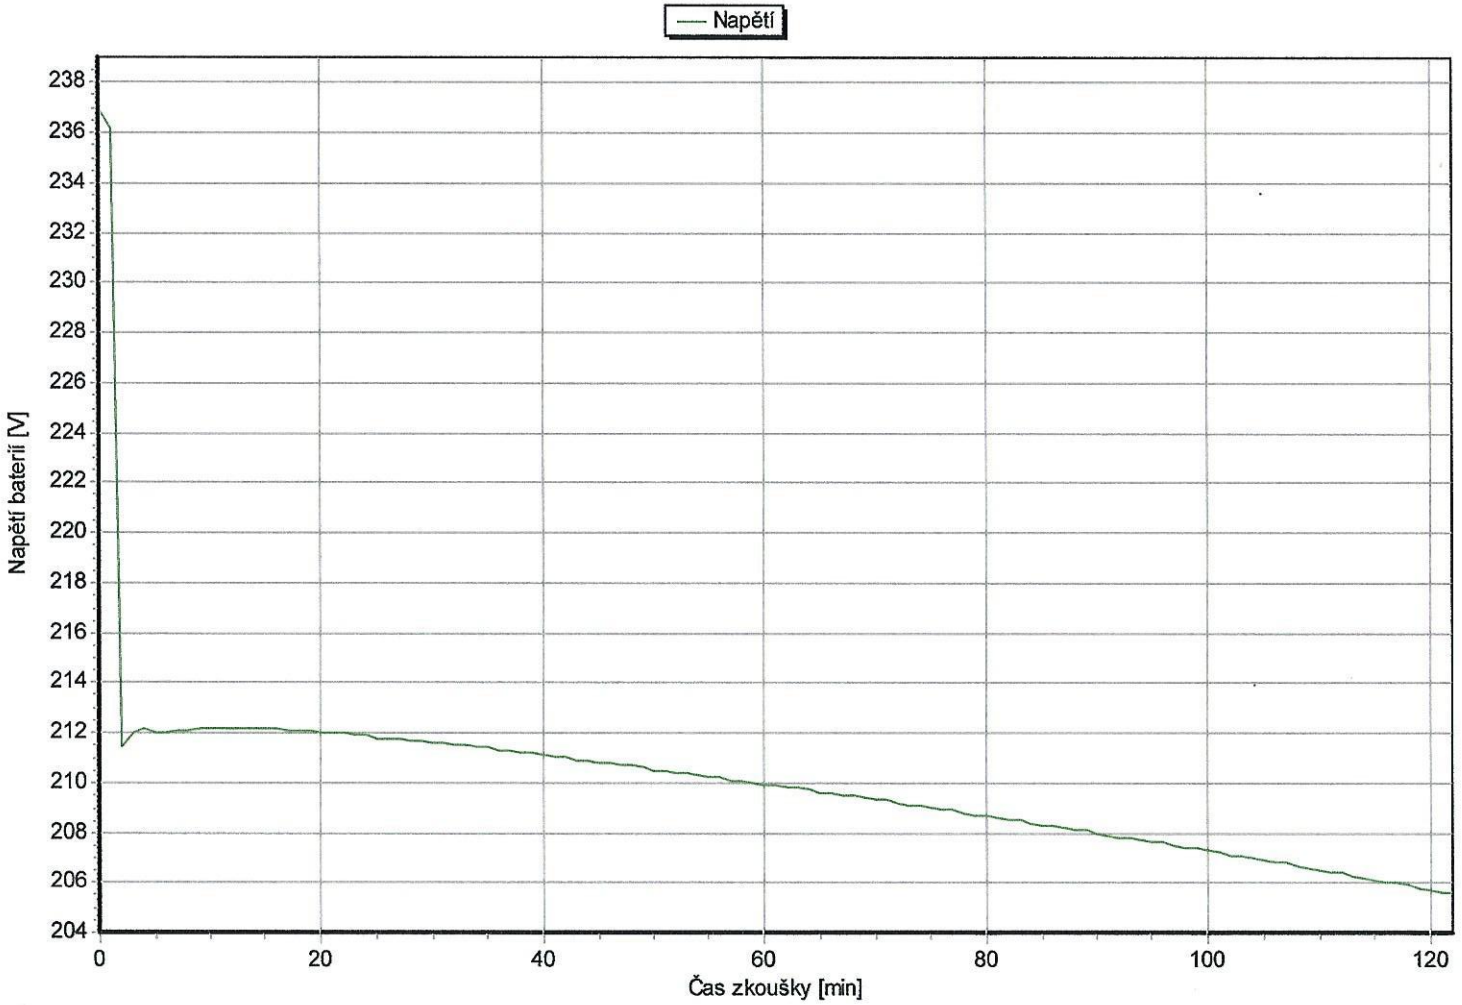

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Zličín

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	38
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2006
Datum:	13.09.18
Čas:	08:09
Typ baterií:	5 OPzS 350
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	100 A
Konečné napětí:	189 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	25,4°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**
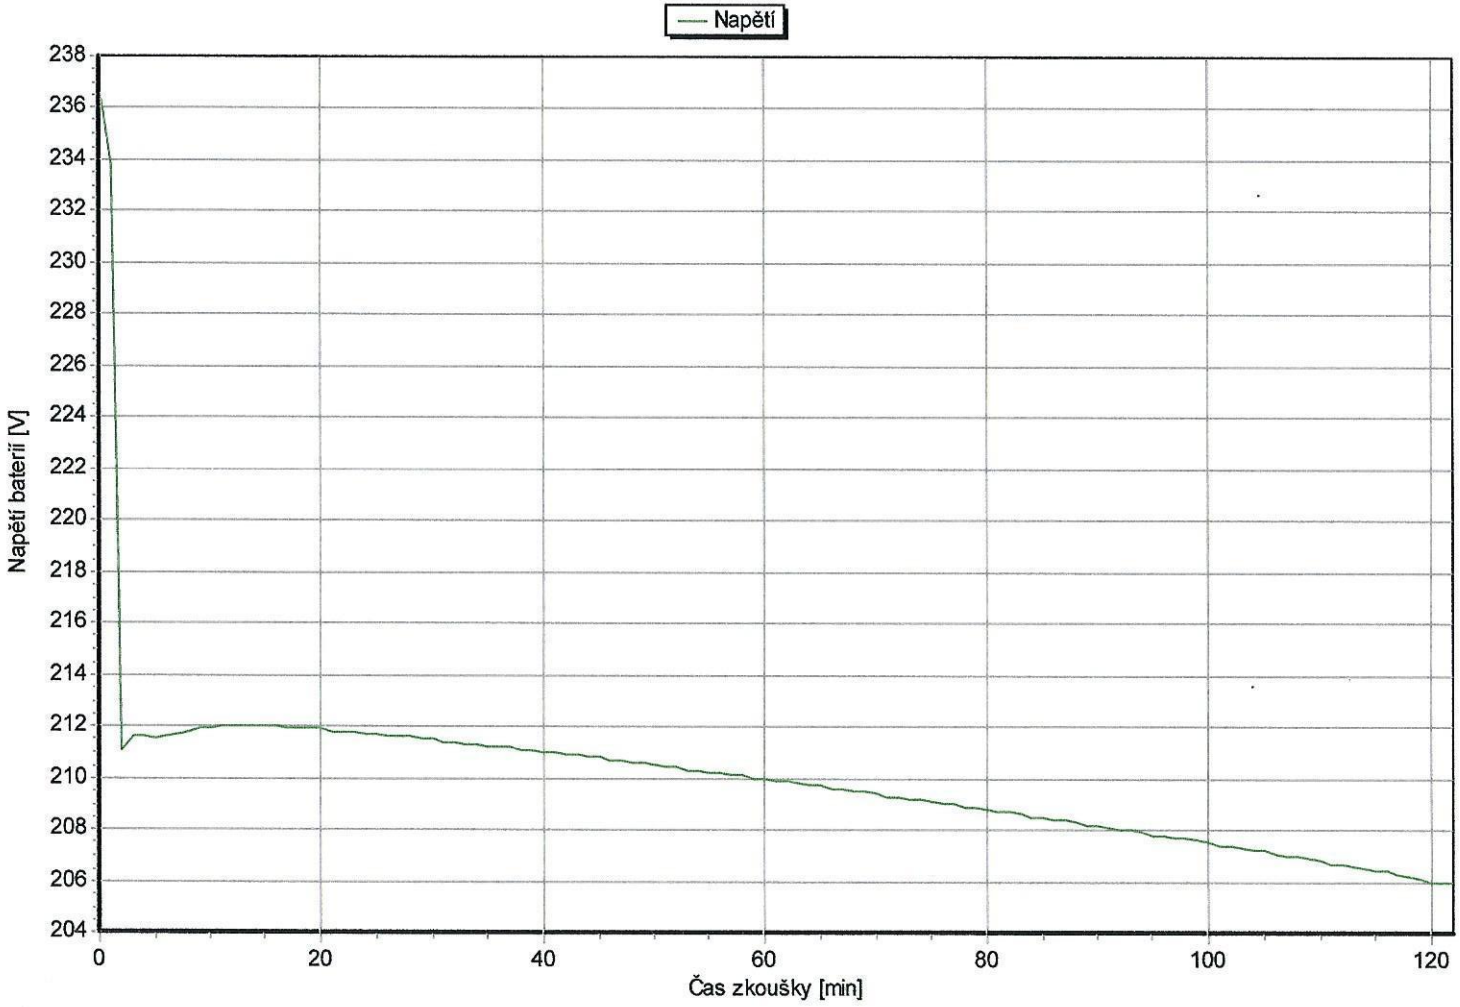
Poznámka:
Baterie se nachází v dobrém stavu.
