Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	15
Číslo baterie	Bat.2, 220V
Datum:	25.03.15
Čas:	12:38
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	17,5 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	177,0 min
Teplota:	28,6°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**98,3 %**

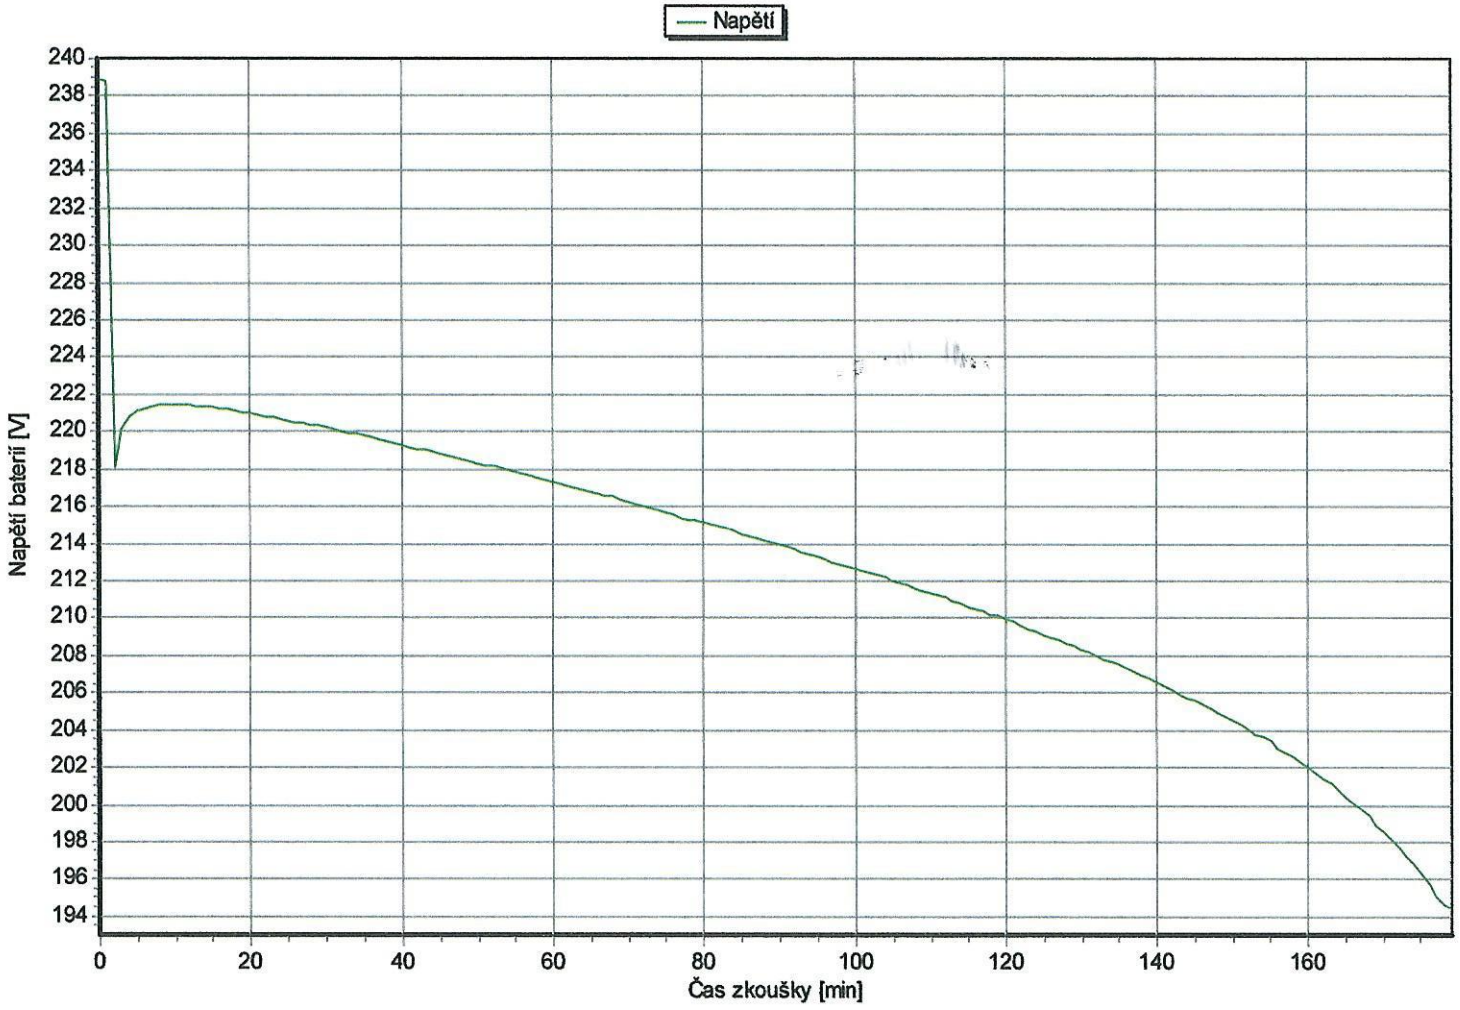

Poznámka:

Bat. se nachází v mírně zhoršeném stavu.
Špatný blok č.17!.

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	14
Číslo baterie	Bat.1, 220V
Datum:	25.03.15
Čas:	09:33
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	17,5 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	176,0 min
Teplota:	28,3°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**97,8 %**

Poznámka:

Bat. je ve zhoršeném stavu. Zhoršené bloky jsou č.4!,5!,9,10,18.

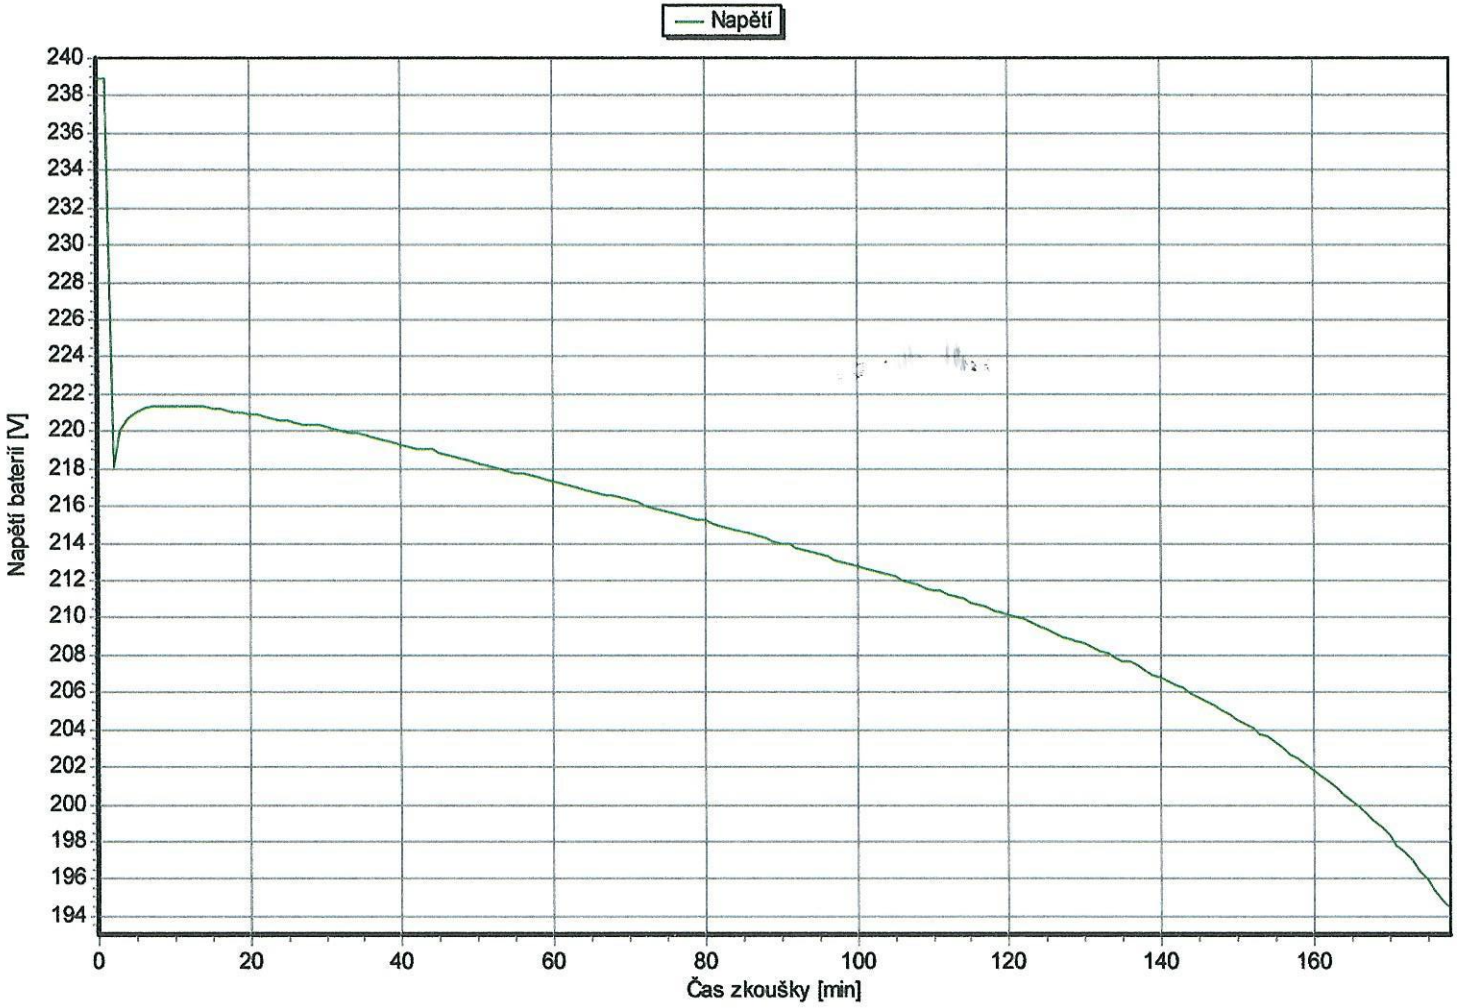

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	13
Číslo baterie	UPS bat. 2.2
Datum:	24.03.15
Čas:	12:21
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	17,5 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	180,0 min
Teplota:	27,1°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Bat. se nachází v mírně zhoršeném stavu.
Mírně zhoršené bloky jsou č. 20,27,28.

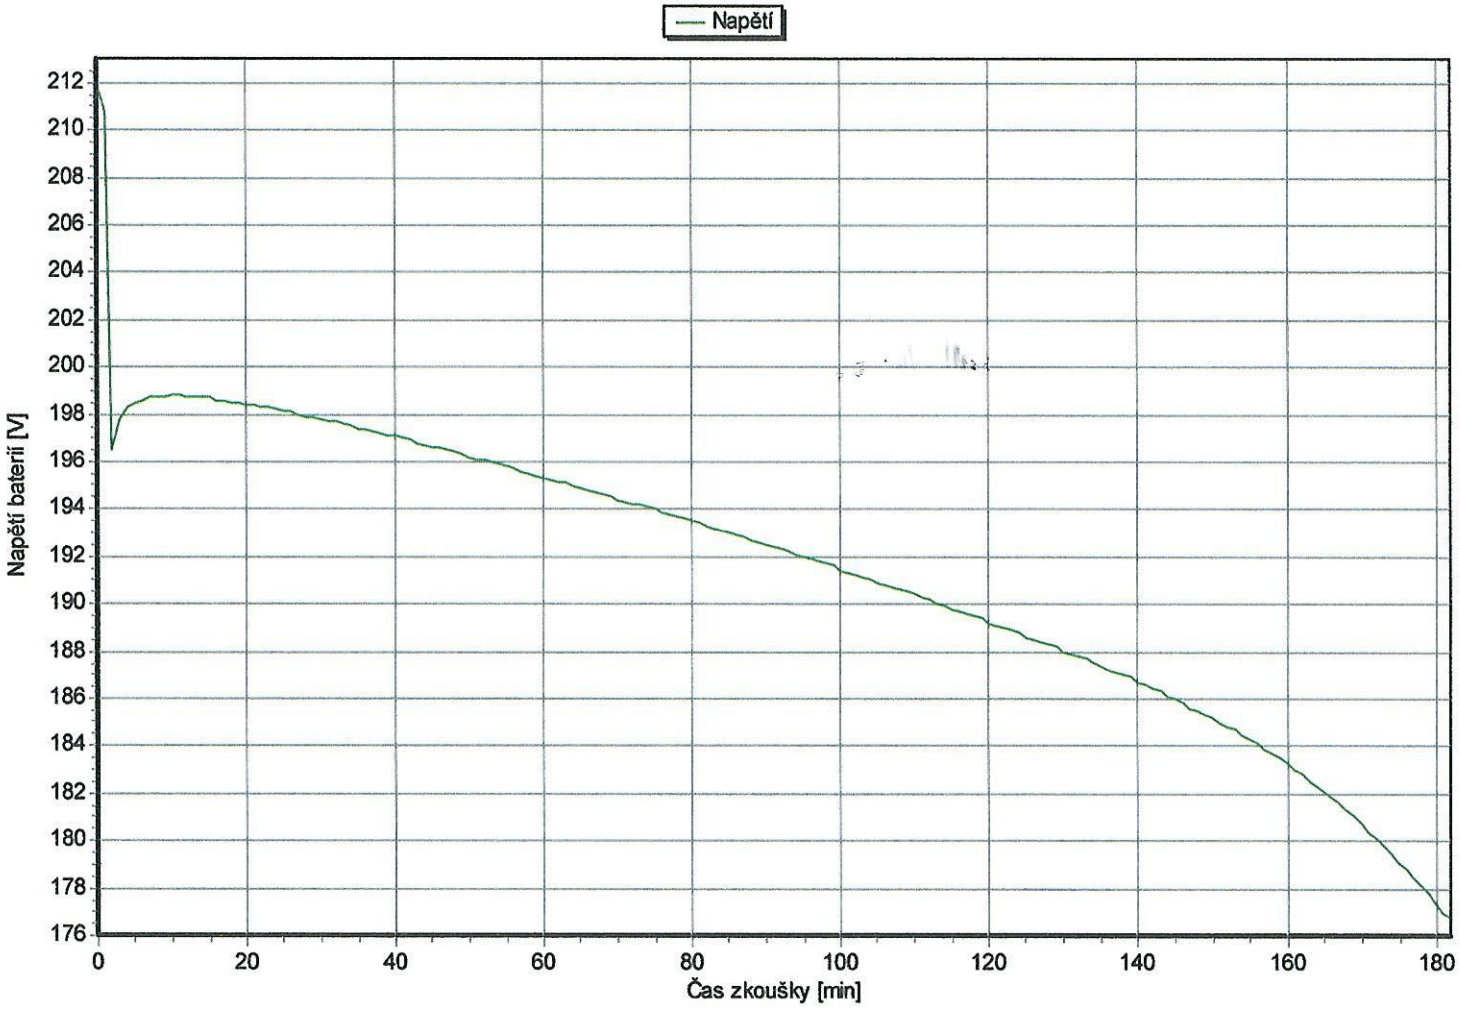

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	12
Číslo baterie	UPS bat. 2.1
Datum:	24.03.15
Čas:	09:27
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	17,5 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	169,0 min
Teplota:	25,5°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o.
	Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**93,9 %**

Poznámka:

Bat. je ve zhoršeném stavu. Špatné bloky jsou č.4!,5,7,8,12!.

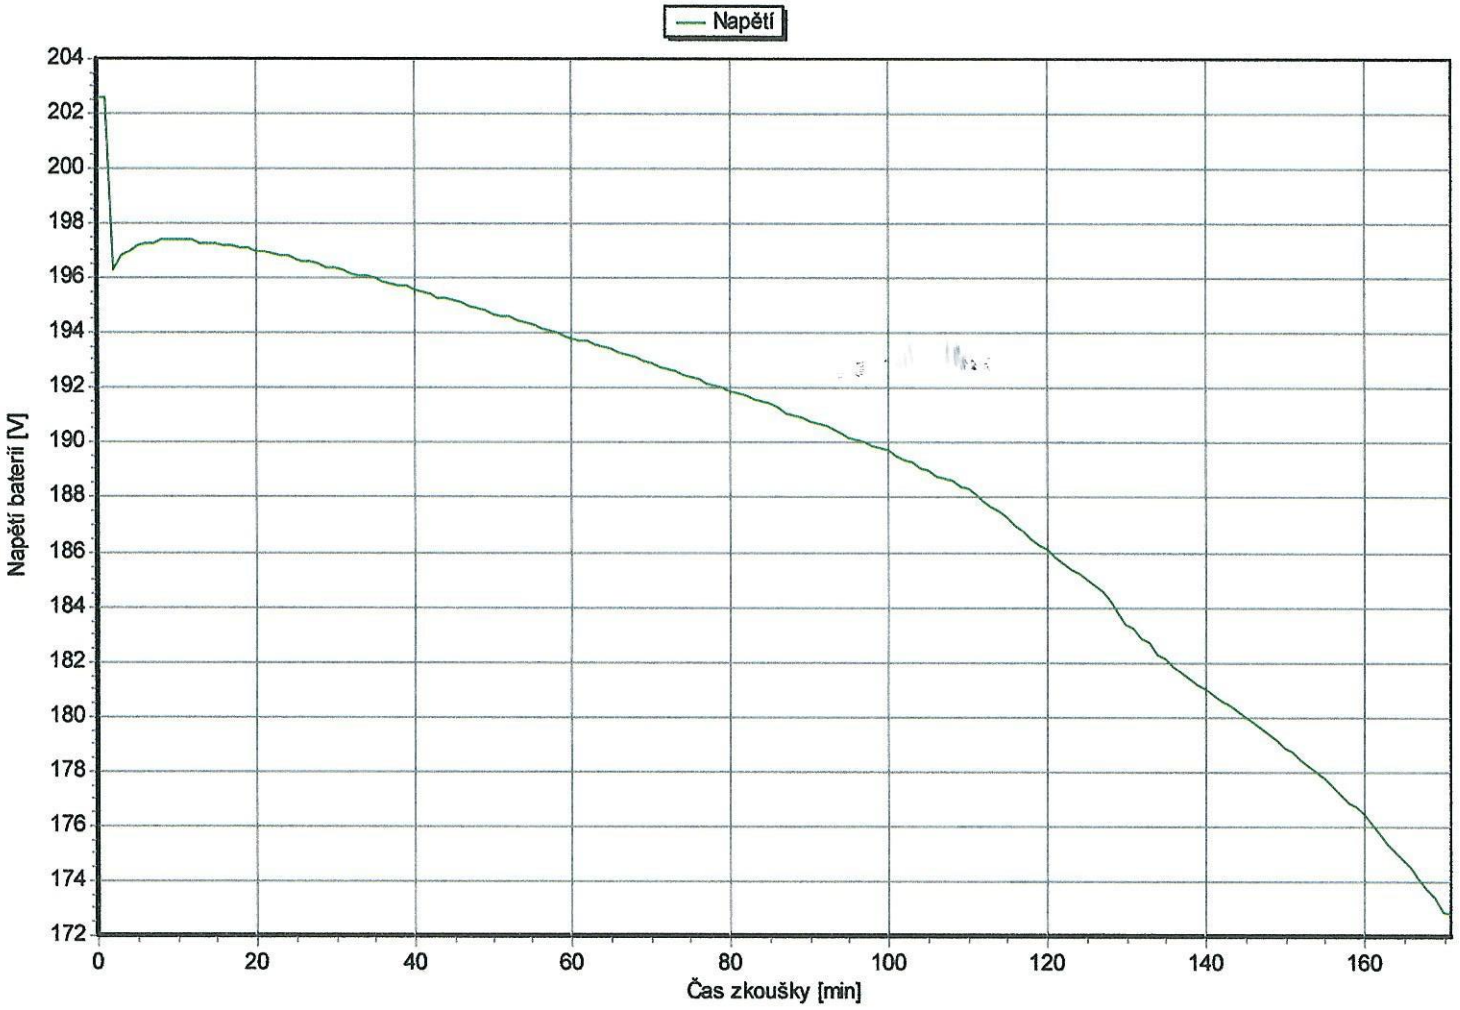

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií

Napětí

Vodivost před

Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	11
Číslo baterie	UPS bat. 1.2
Datum:	18.03.15
Čas:	11:52
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	180 min
Vybíjecí proud:	17,5 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	180,0 min
Teplota:	26,5°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	180,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

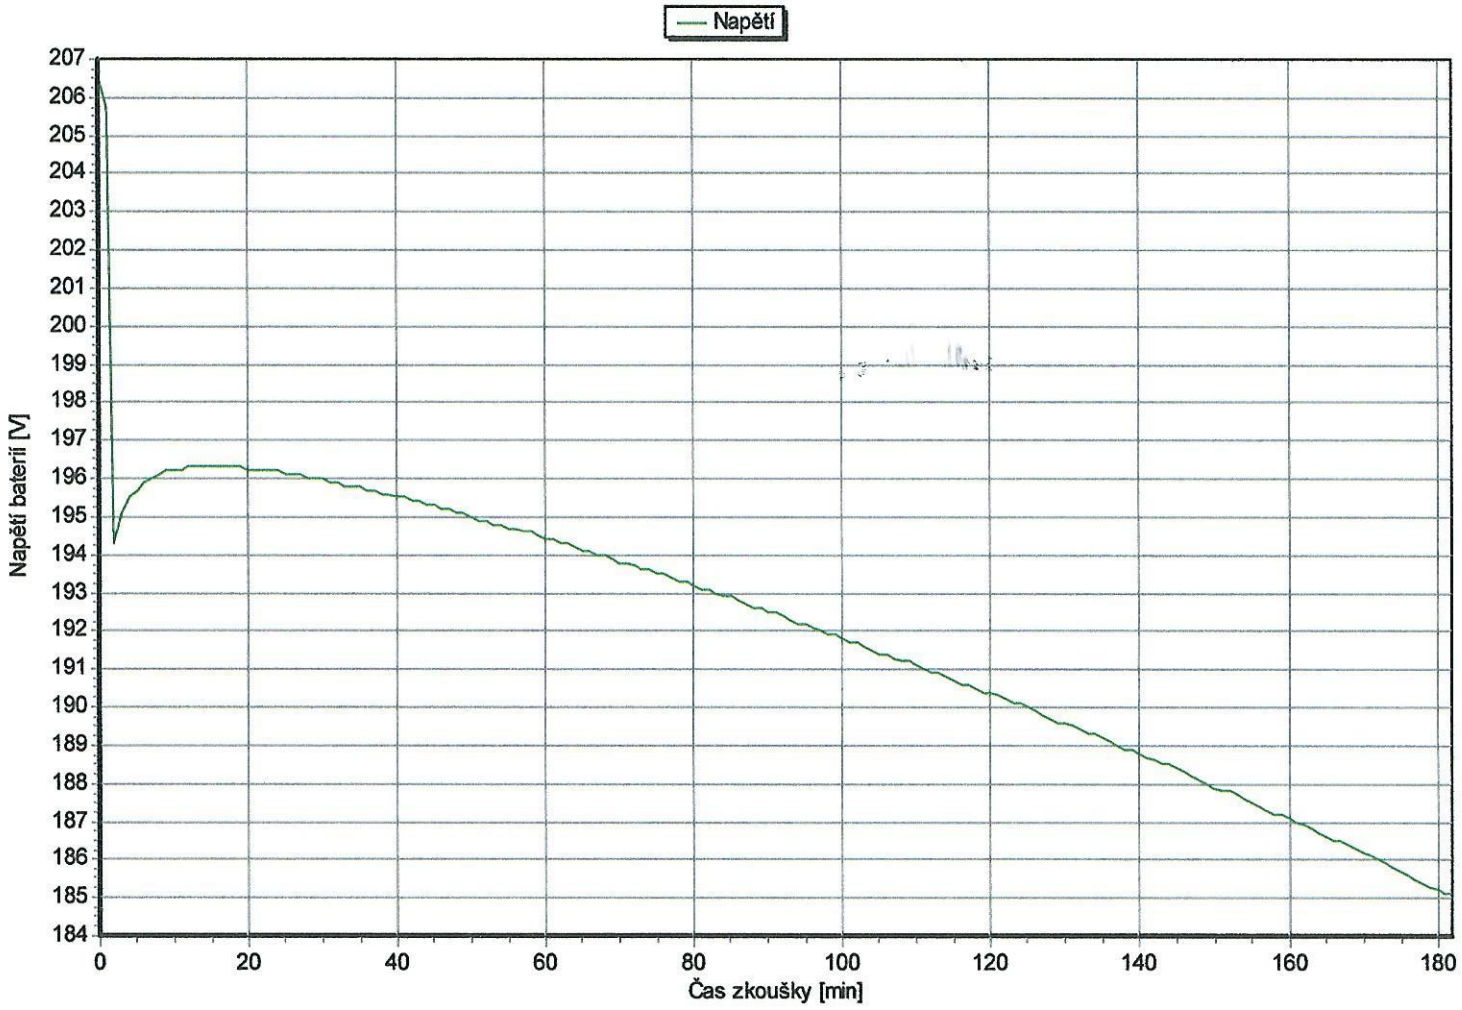

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

Čísla baterií
Napětí
Vodivost před
Vodivost po

Konečné napětí

Číslo testu:	10
Číslo baterie	UPS bat. 1.1
Datum:	18.03.15
Čas:	09:42
Typ baterií:	SB 12V 60
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	27,5 A
Konečné napětí:	172,8 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	114,0 min
Teplota:	25,8°C
Za provozovatele:	
Měřil:	PEG s.r.o. Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**95,0 %**

Poznámka:
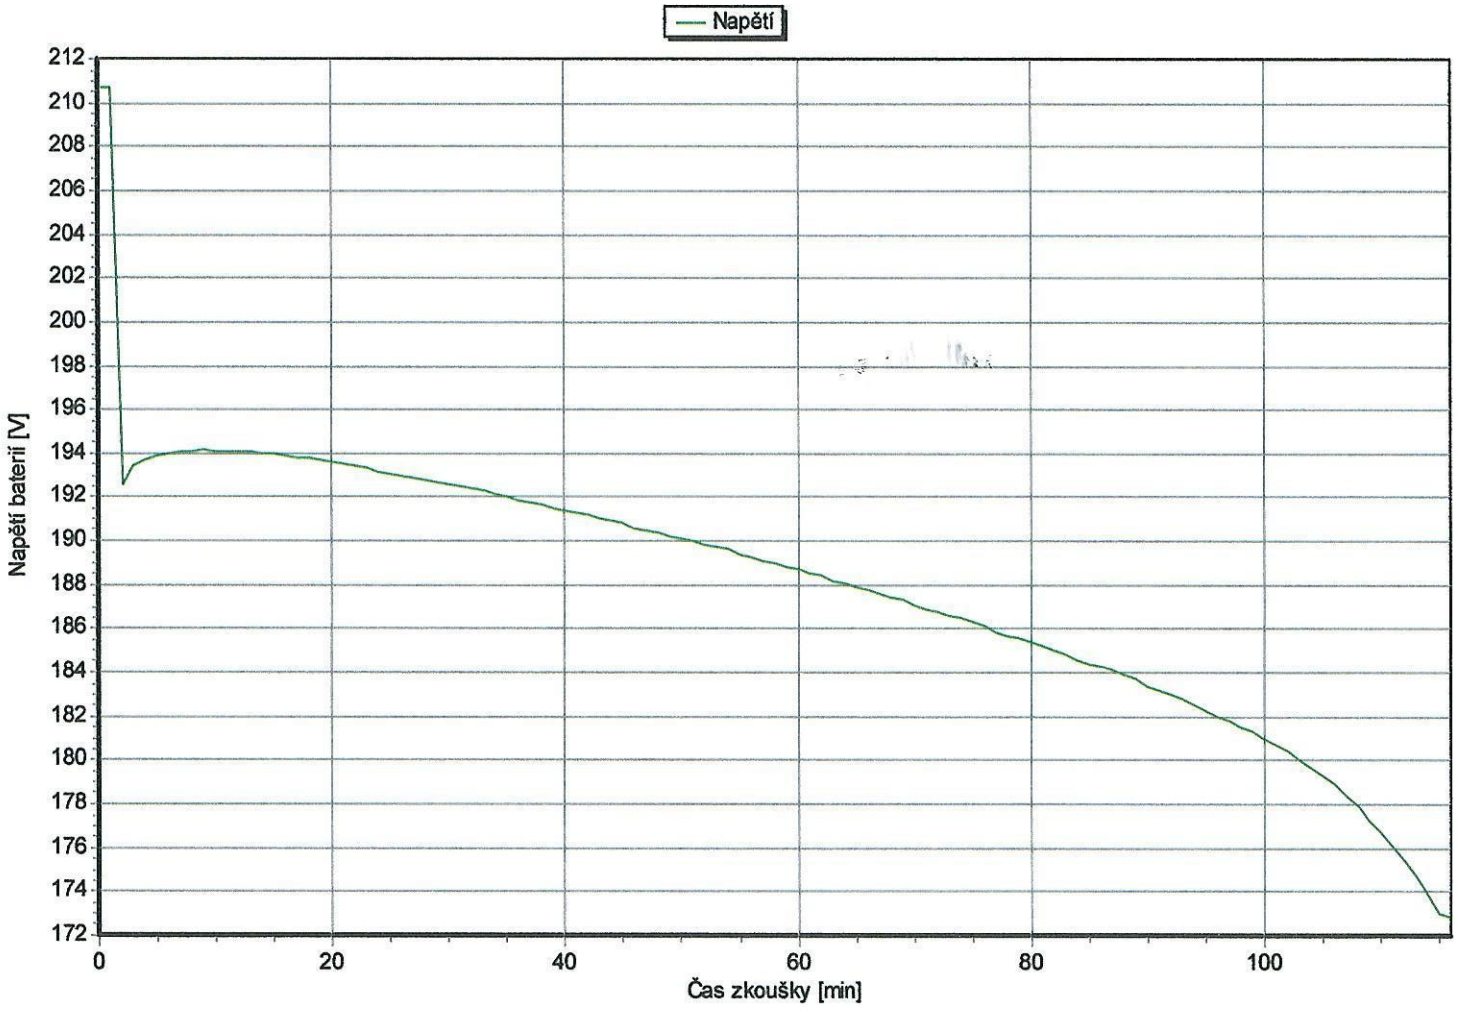
Bat. se nachází ve zhoršeném stavu.
Špatný blok č.14.
