# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Jih

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Čislo testu: | 1 |
| Číslo baterie | GB1, 220V, r.v.2006 |
| Datum: | 01.04.21 |
| Čas: | 07:51 |
| Typ baterií: | 6 OPzS 420 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 50 A |
| Konečné napětí: | 194,4 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 12,9°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

| Konečné napětí | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

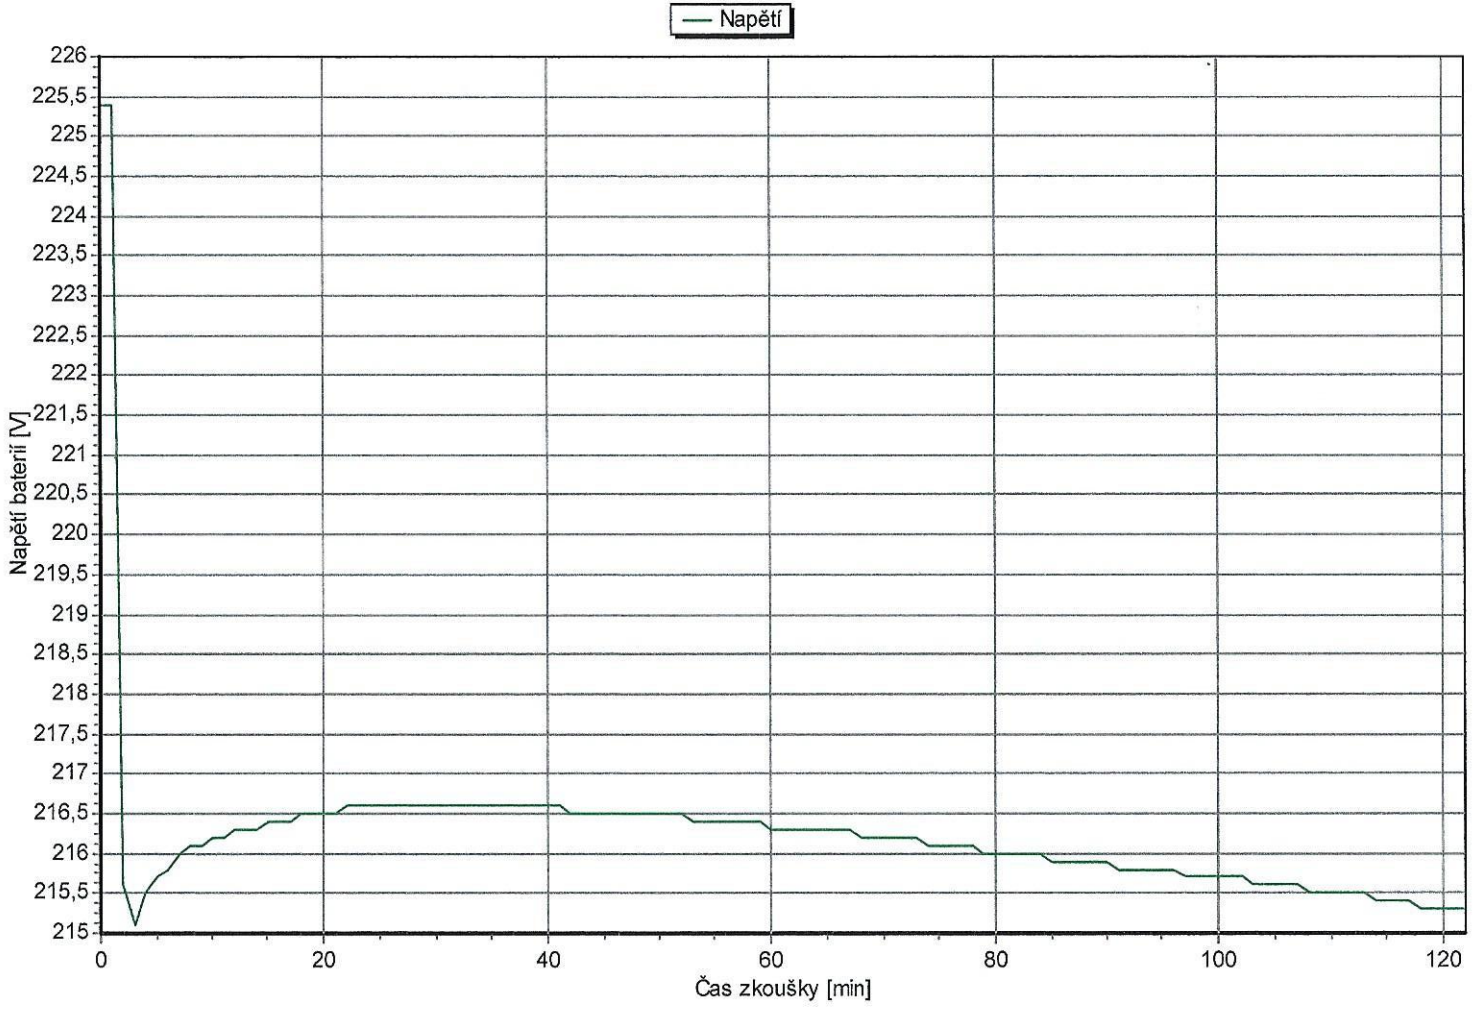

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Jih

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Čislo testu: | 2 |
| Číslo baterie | GB2, 220V, r.v.2007 |
| Datum: | 01.04.21 |
| Čas: | 09:59 |
| Typ baterií: | 6 OPzS 420 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 50 A |
| Konečné napětí: | 194,4 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 15,2°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.
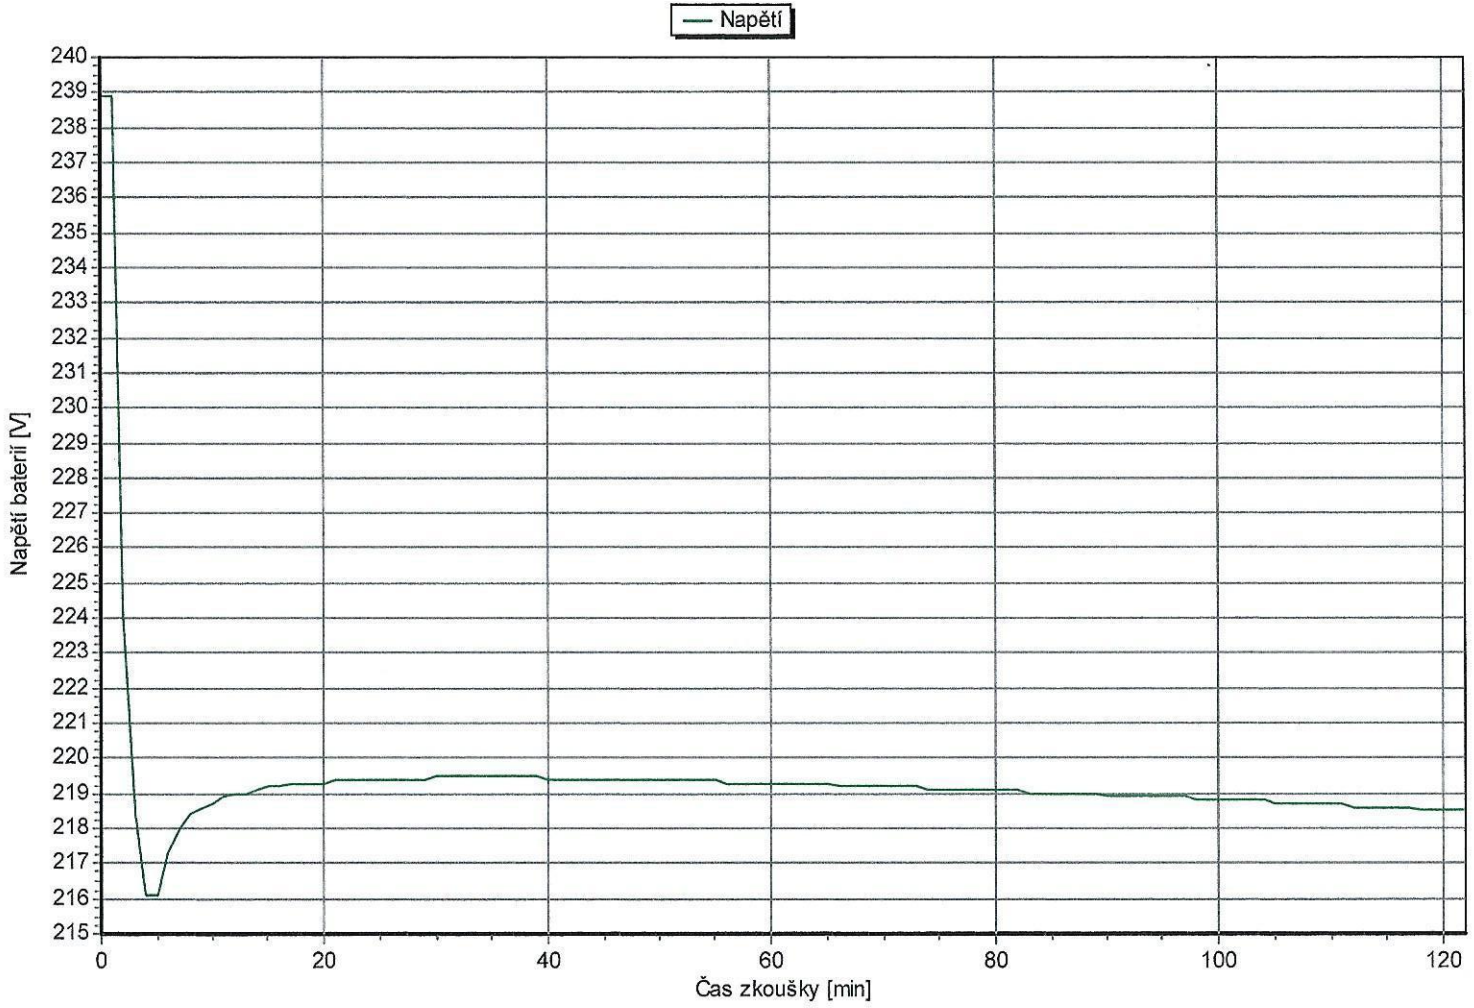
| Konečné napětí | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
