# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 9 |
| Číslo baterie | Bat. UPS 2/2, bl.17-32 |
| Datum: | 25.11.21 |
| Čas: | 13:06 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 172,8 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 24,8°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu. Blok 17-32.

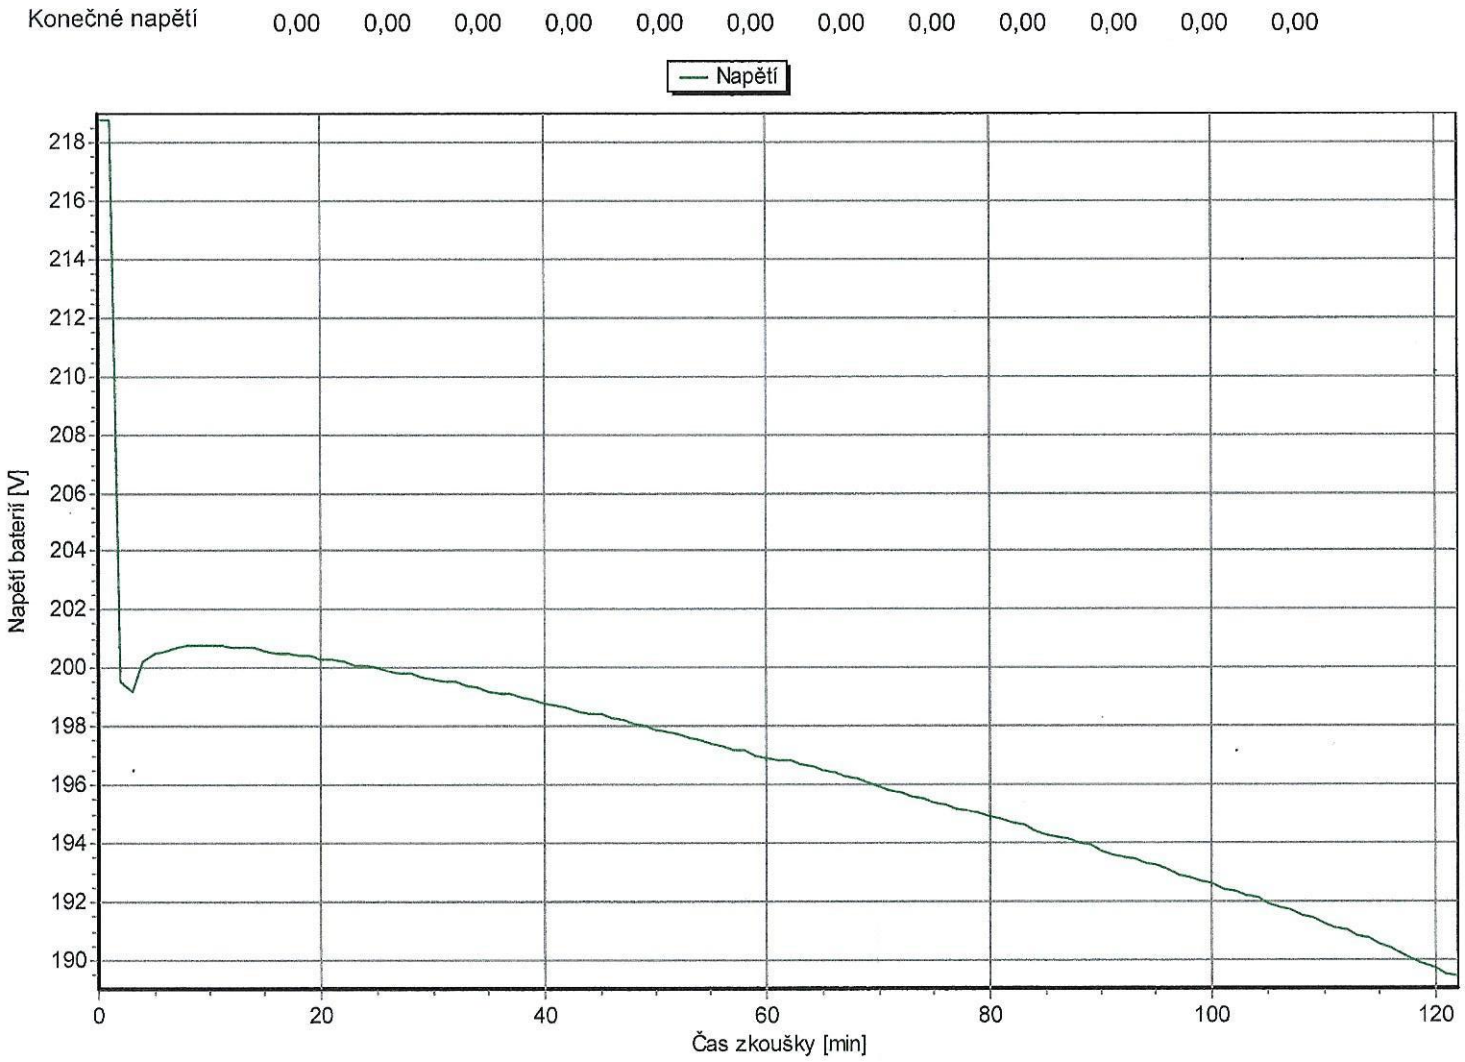

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 8 |
| Číslo baterie | Bat. UPS 2/1, bl.1-16 |
| Datum: | 25.11.21 |
| Čas: | 10:58 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 172,8 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 25,5°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu. Blok 1-16.

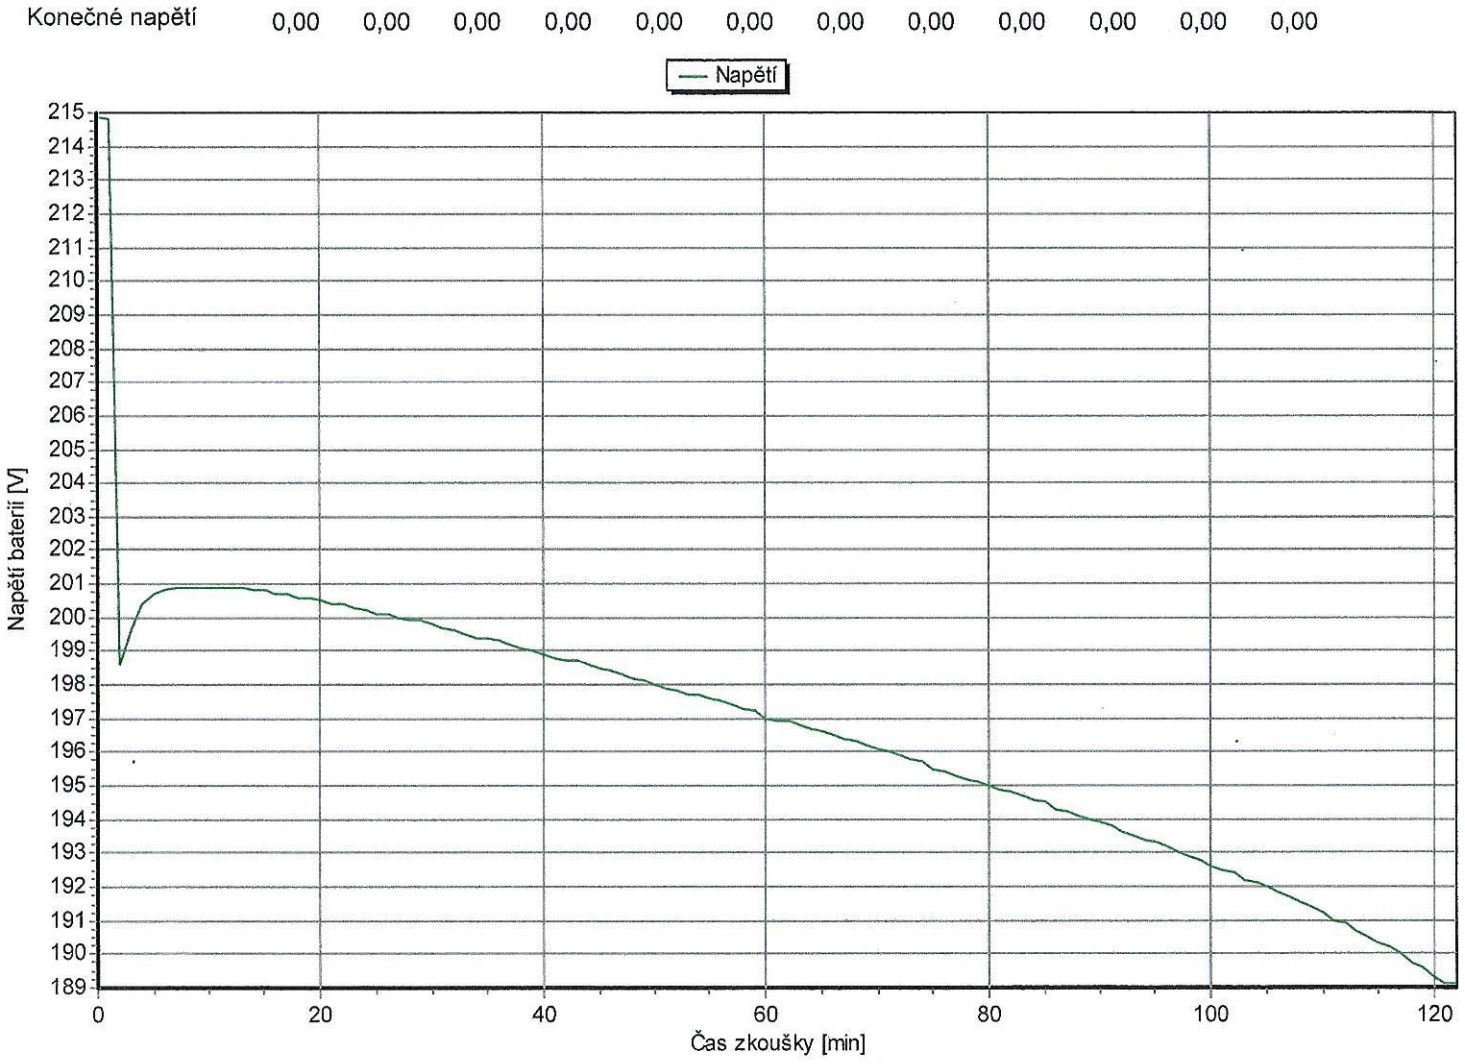

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 7 |
| Číslo baterie | Bat. UPS 1/2, bl.17-32 |
| Datum: | 25.11.21 |
| Čas: | 08:48 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 172,8 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 25,5°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu. Blok 17-32.

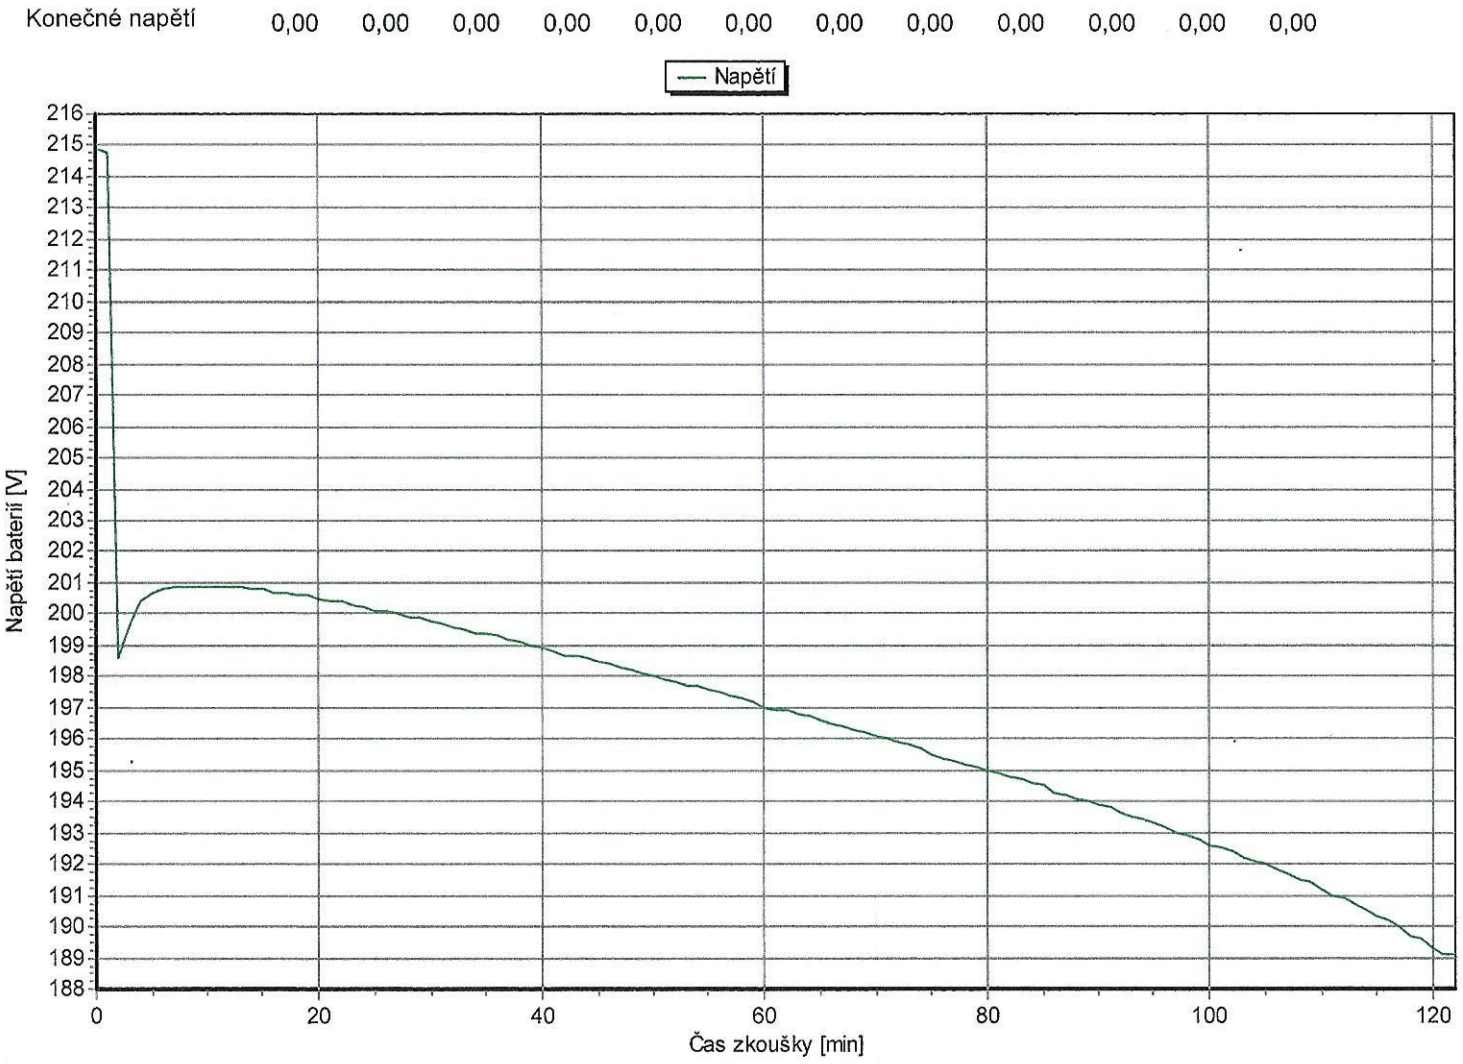

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 6 |
| Číslo baterie | Bat. UPS 1/1, bl.1-16 |
| Datum: | 24.11.21 |
| Čas: | 13:10 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 172,8 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 120,0 min |
| Teplota: | 24,8°C |
| Za provozovatele: | Peg s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,0 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu. Blok 1-16.

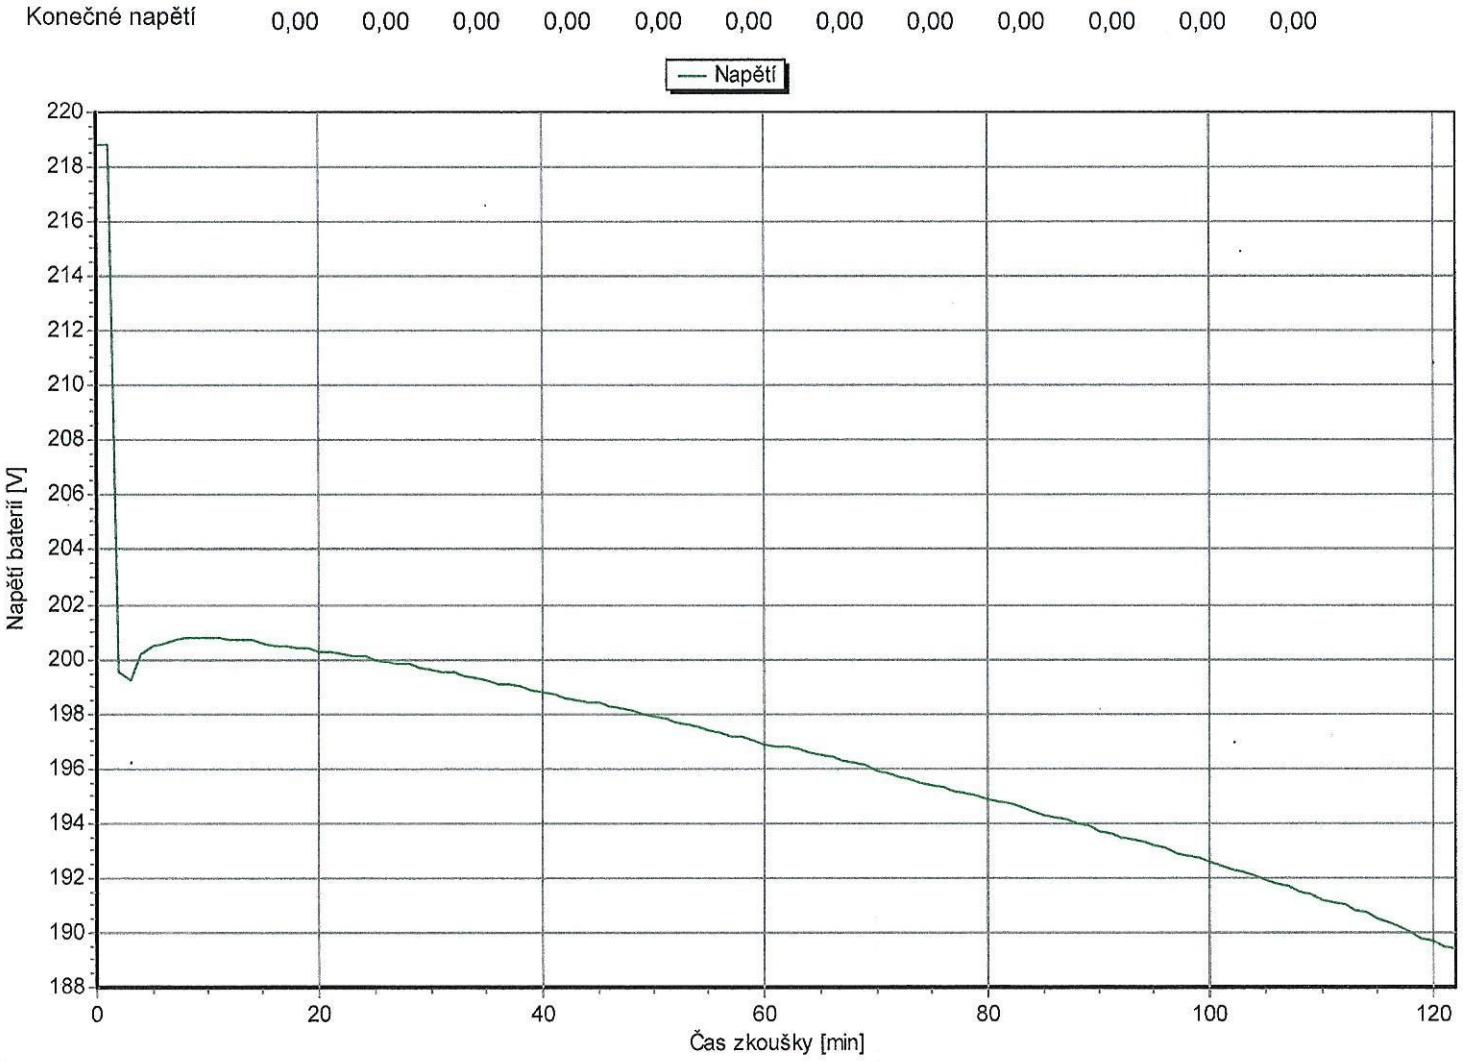

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 5 |
| Číslo baterie | Bat. 2, 220V |
| Datum: | 24.11.21 |
| Čas: | 11:00 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 194,4 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 121,0 min |
| Teplota: | 23,4°C |
| Za provozovatele: | PEG s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |
| Vztažná kapacita: | 120,0 min |
| Kapacita: | **100,8 %** |

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

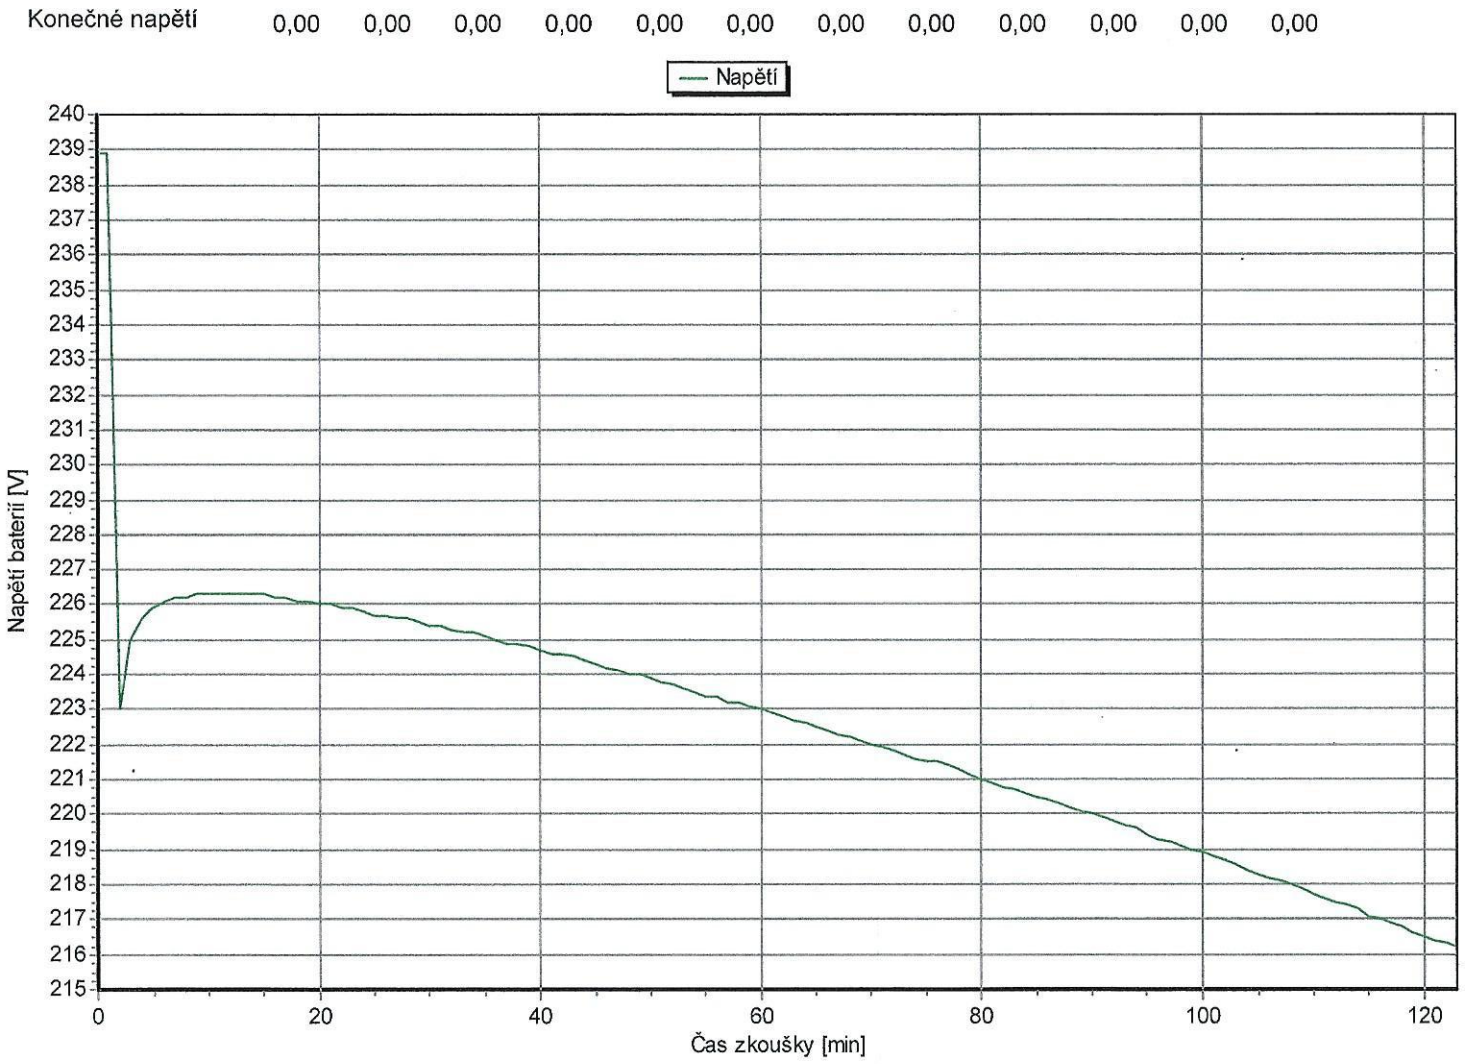

# Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Smíchov

Zakázka:

PRE

| | |
|---|---|
| Číslo testu: | 4 |
| Číslo baterie | Bat. 1, 220V |
| Datum: | 24.11.21 |
| Čas: | 08:50 |
| Typ baterií: | Power 12-50 |
| Typ zkoušky: | 120 min |
| Vybíjecí proud: | 18,4 A |
| Konečné napětí: | 194,4 V |
| Délka cyklu: | 60 s |
| Délka zkoušky: | 121,0 min |
| Teplota: | 23,2°C |
| Za provozovatele: | PEG s.r.o. |
| Měřil: | Kašpar |

Vztažná kapacita: 120,0 min

Kapacita: **100,8 %**

Poznámka:
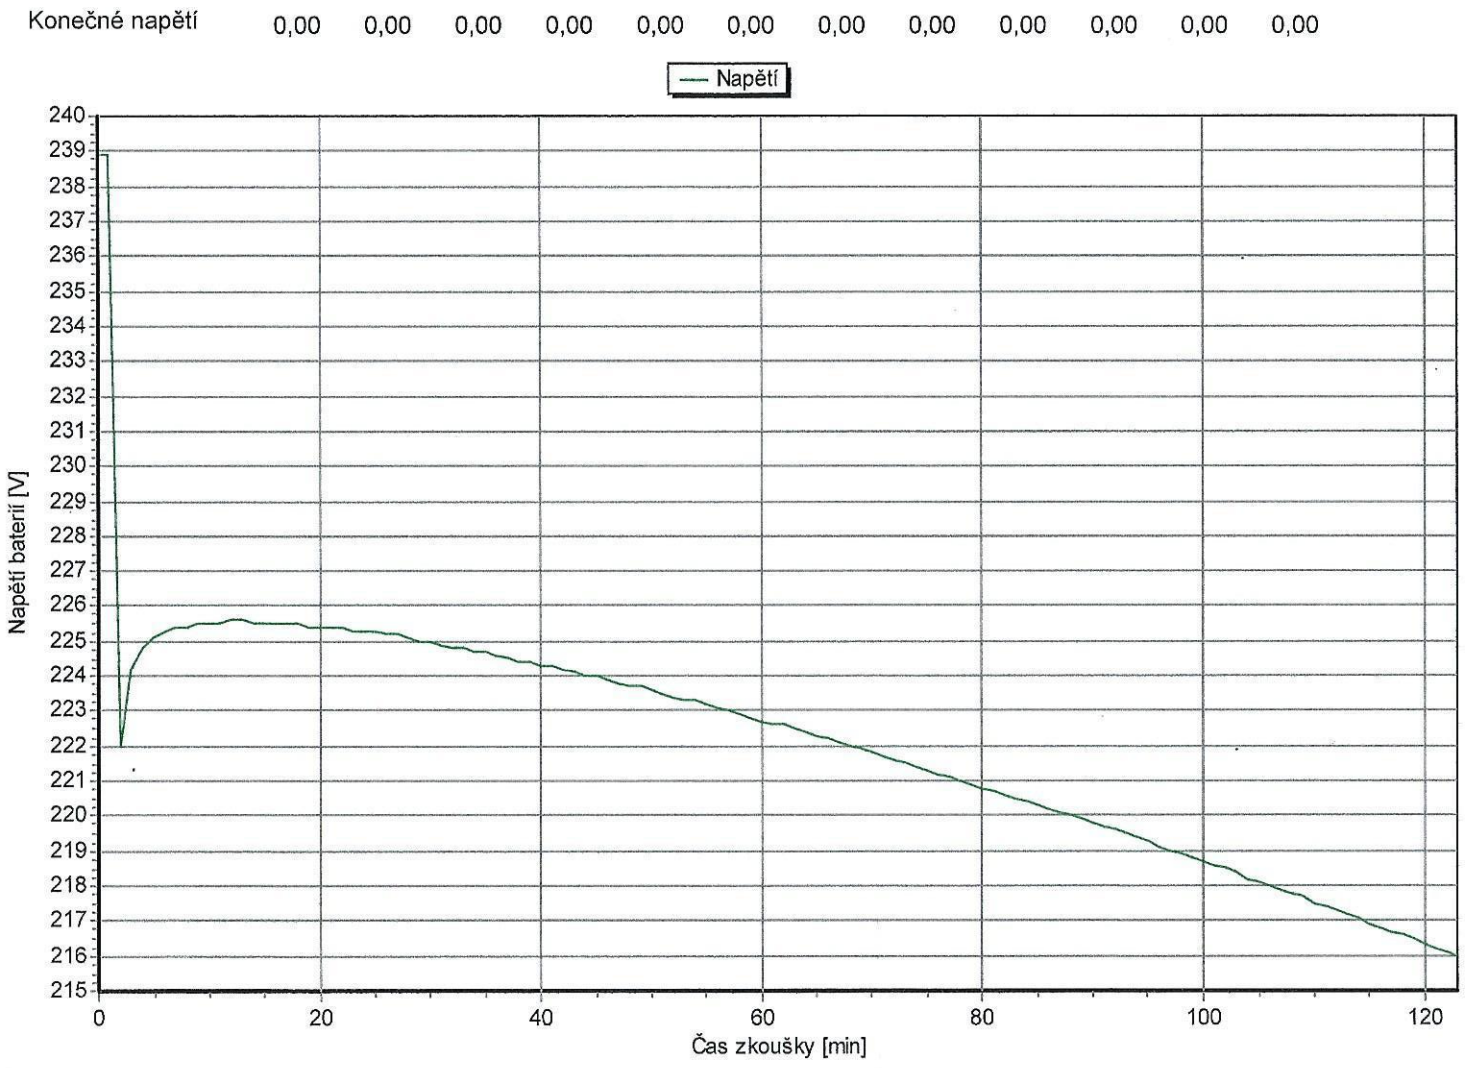
Baterie se nachází v dobrém stavu.
