Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Třeboradice

Zakázka:

PRE

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

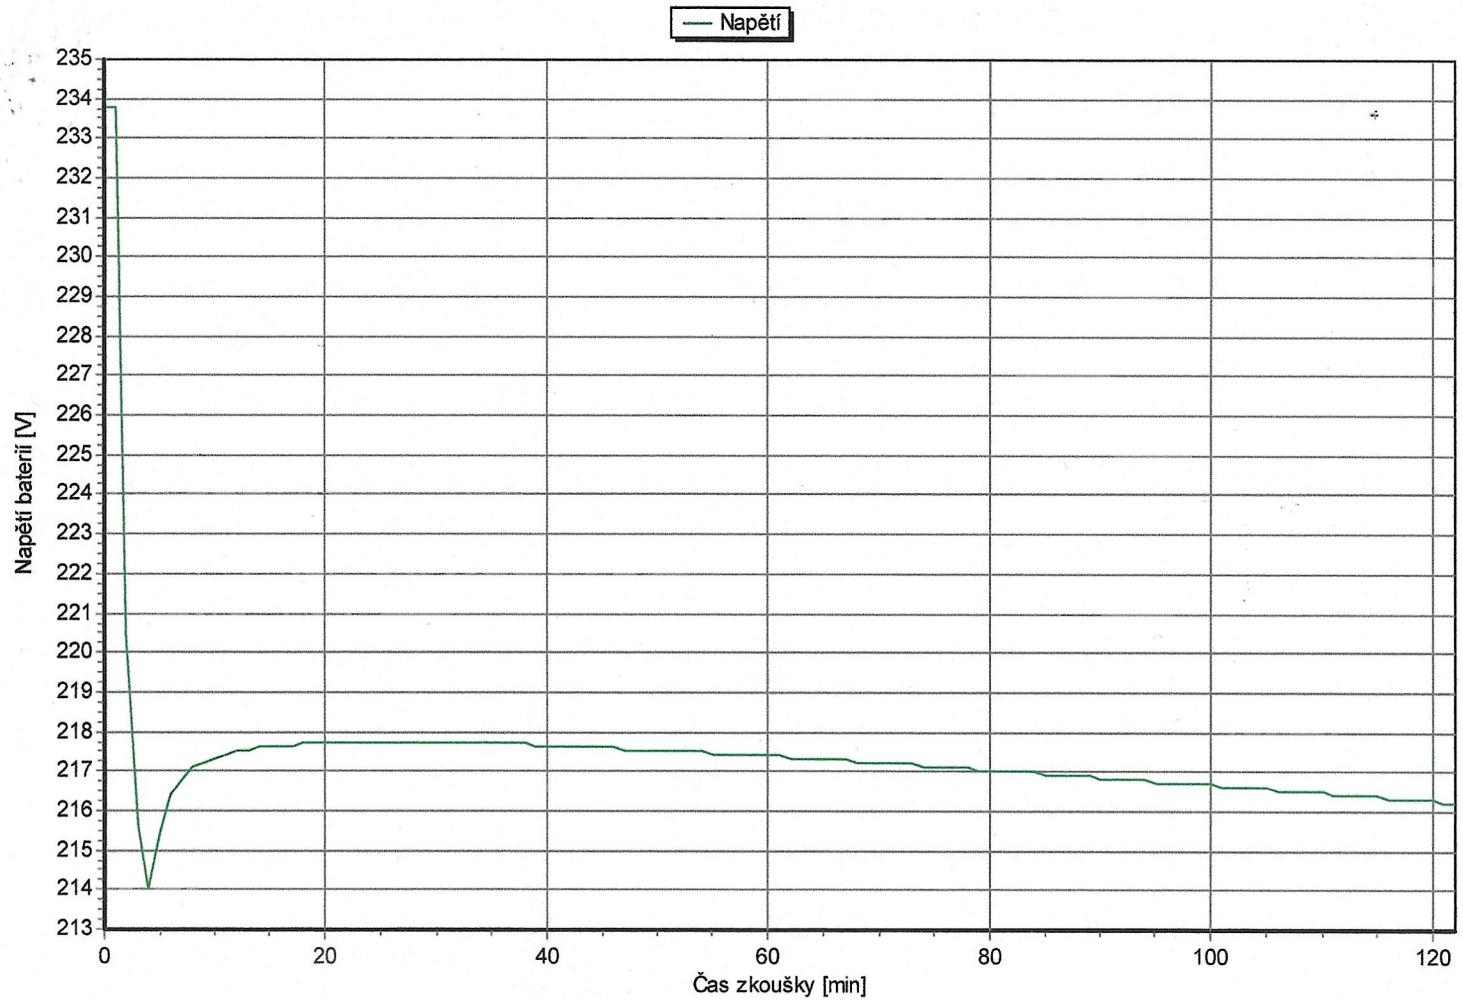

Číslo testu:	8
Číslo baterie	Bat.2, 220V, r.v.2014
Datum:	28.05.25
Čas:	08:48
Typ baterií:	6 OPzS 420
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	23,0°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:

Baterie se nachází v dobrém stavu.

Kapacitní zkouška baterií

Lokalita:

TR Třeboradice

Zakázka:

PRE

Konečné napětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo testu:	7
Číslo baterie	Bat.1, 220V, r.v.2014
Datum:	28.05.25
Čas:	06:42
Typ baterií:	6 OPzS 420
Typ zkoušky:	120 min
Vybíjecí proud:	50 A
Konečné napětí:	194,4 V
Délka cyklu:	60 s
Délka zkoušky:	120,0 min
Teplota:	22,7°C
Za provozovatele:	PEG s.r.o.
Měřil:	Kašpar
Vztažná kapacita:	120,0 min
Kapacita:	**100,0 %**

Poznámka:
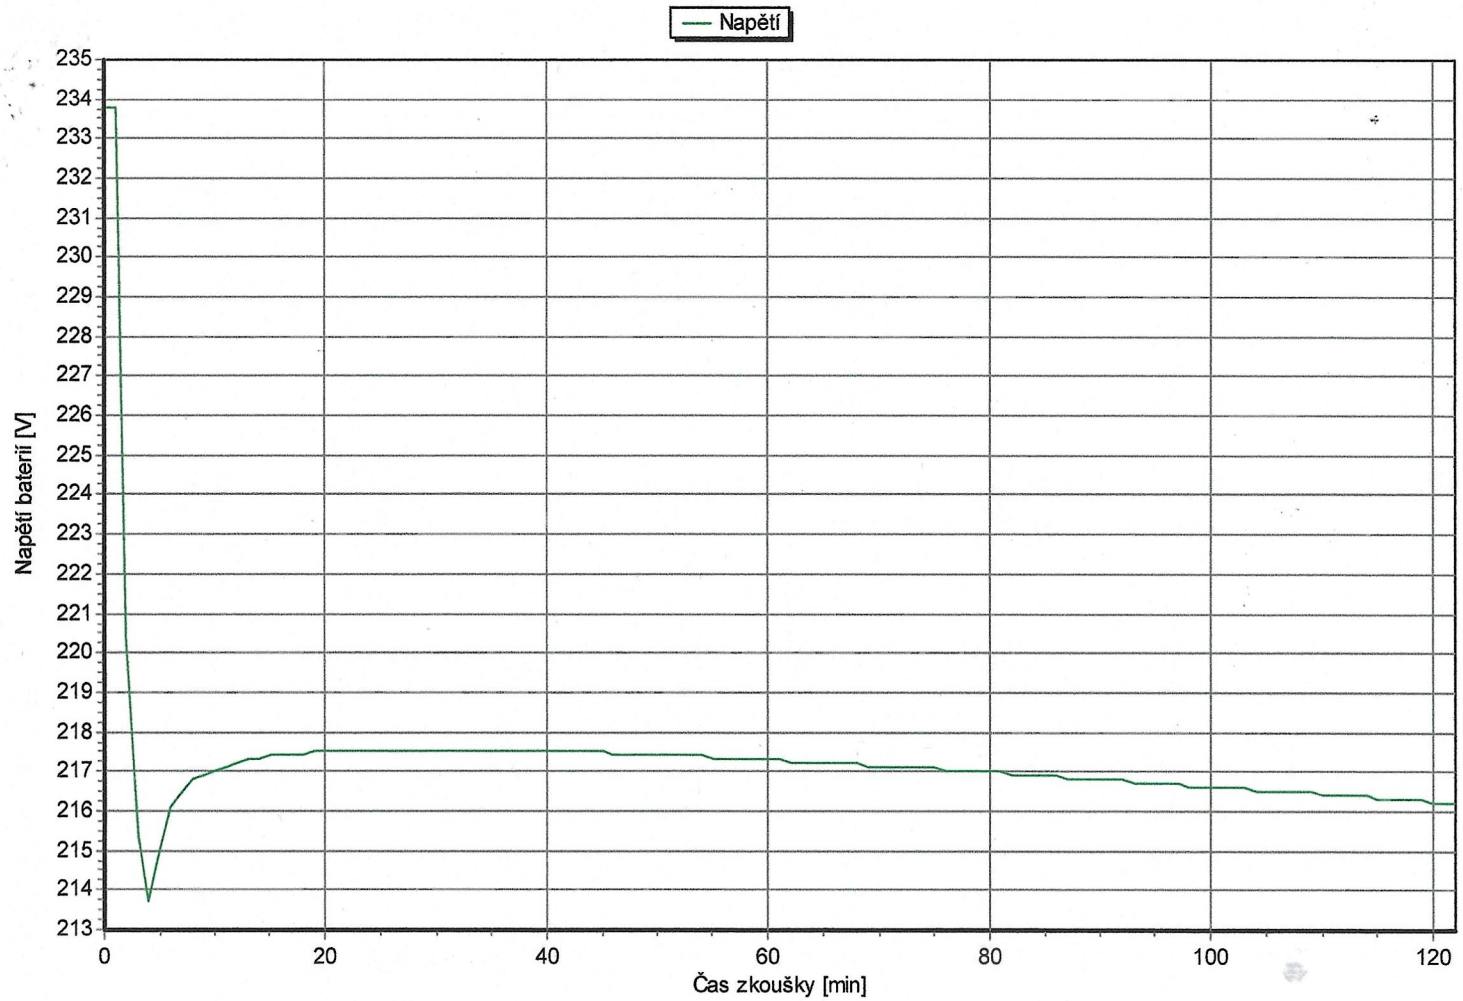
Baterie se nachází v dobrém stavu.
